

Projekt Manager
Projektbeginn/ende

22.06.2026 - 30.01.2027

Fortschritt
Vorgänge
Ressourcen

0%
84
0


Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Außentreppe	07.07.26	08.07.26
Dachabdichtung	09.07.26	24.09.26
Eindichten Treppe	09.07.26	22.07.26
WC Anbau, Loggia, Vordach	23.07.26	05.08.26
Dachbegrünung Mensa	11.09.26	24.09.26
Attikaabdeckung	07.09.26	11.09.26
Rohbauarbeiten	04.09.26	10.09.26
Außenwand Giebel schließen	04.09.26	10.09.26
Sockelputz	03.08.26	14.08.26
Fassade	22.06.26	09.10.26
Aufmaß Fassade	22.06.26	26.06.26
Arbeitsvorbereitung Fassade	29.06.26	04.09.26
Fassadenmontage	07.09.26	09.10.26
Fensterarbeiten	22.06.26	06.01.27
Abstimmung Fensterbänke, Jalousien	22.06.26	22.06.26
Montage Fensterbänke, Jalousien	21.07.26	27.07.26
Eingangstüren	04.01.27	06.01.27
Blitzschutz	07.09.26	18.09.26
Gerüst Fassade	23.06.26	12.10.26
Gerüst RLT Gerät	07.08.26	11.09.26
Außenanlage	12.10.26	20.11.26
Erdarbeiten Trafo + WP	27.10.26	23.11.26
Deckendurchbrüche RLT Bestand	27.07.26	31.07.26
Bodensanierung	03.08.26	13.08.26
Bodenausgleich entfernen	03.08.26	06.08.26
Neuen Bodenausgleich aufbringen	07.08.26	07.08.26
Abdichtung aufbringen	12.08.26	13.08.26
Trockenausbau	17.08.26	27.11.26
Wände einseitig stellen	17.08.26	28.08.26
DG: Energetische Ertüchtigung	21.08.26	03.09.26
Wände schließen	14.09.26	25.09.26
Wände spachteln u. schleifen	02.11.26	06.11.26
Decken Einbau mit Lüftung	09.11.26	20.11.26
Restl. Decken	23.11.26	27.11.26
Heizung	03.08.26	02.10.26
Rohinstallation	03.08.26	28.08.26
Fußbodenheizung	30.09.26	02.10.26
Fertiginstallation Anbindungen	05.10.26	04.12.26
Lüftung	27.07.26	20.11.26
DG Lüftungsgerät einbringen	03.08.26	20.08.26
Rohinstallation	27.07.26	21.08.26
Lüftungseinbau mit Trockenbauer	09.11.26	20.11.26
Fertiginstallation	02.11.26	20.11.26
Elektro	03.08.26	11.12.26
in die Fassade legen	03.08.26	04.08.26
Rohinstallation	03.08.26	28.08.26
Fertiginstallation	23.11.26	11.12.26
Außenbeleuchtung, etc.	12.10.26	16.10.26
Sanitär	03.08.26	04.01.27
Rohinstallation	03.08.26	28.08.26
Fertiginstalltion Küche	30.11.26	11.12.26
Fertiginstallation WC, etc.	26.11.26	02.12.26
Küche Neu	30.11.26	11.12.26
Küchenumbau	04.01.27	04.01.27

Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Innenputz	31.08.26	11.09.26
Esricharbeiten	28.09.26	30.10.26
Dämmung	28.09.26	29.09.26
Heizestrich + Dünnestrich	05.10.26	09.10.26
Aufheizung	19.10.26	30.10.26
Malerarbeiten	02.11.26	15.01.27
Putzwände Spachteln und Schleifen	02.11.26	06.11.26
Tapete	30.11.26	11.12.26
Malerarbeiten	11.01.27	15.01.27
Fliesenarbeiten Küche	02.11.26	20.11.26
WC-Trennwände	16.09.26	27.11.26
Aufmaß	16.09.26	16.09.26
Einbau WC-Trennwände	26.11.26	27.11.26
Kautschukbeläge	09.11.26	27.11.26
Spachteln & Schleifen	09.11.26	11.11.26
WC's Boden + Wände	12.11.26	25.11.26
Mensa	23.11.26	27.11.26
Innentüren	14.09.26	02.12.26
Aufmaß	14.09.26	14.09.26
Einbau	26.11.26	02.12.26
Bauendreinigung	18.01.27	18.01.27
Küche	30.11.26	08.01.27
Neue Küche	30.11.26	11.12.26
Bestehende Küche abbaunen und aufbauen	04.01.27	08.01.27
Möblierung Mensa	18.01.27	29.01.27
Kunst am Bau Planungsbeginn	22.06.26	22.06.26
Abnahmen	11.01.27	15.01.27
Sommerferien, Übergänge z. Bestand	29.06.26	07.08.26
Herbstferien, Übergänge z. Bestand	05.10.26	16.10.26
Weihnachten, Übergänge z. Bestand	21.12.26	08.01.27

Gantt-Diagramm

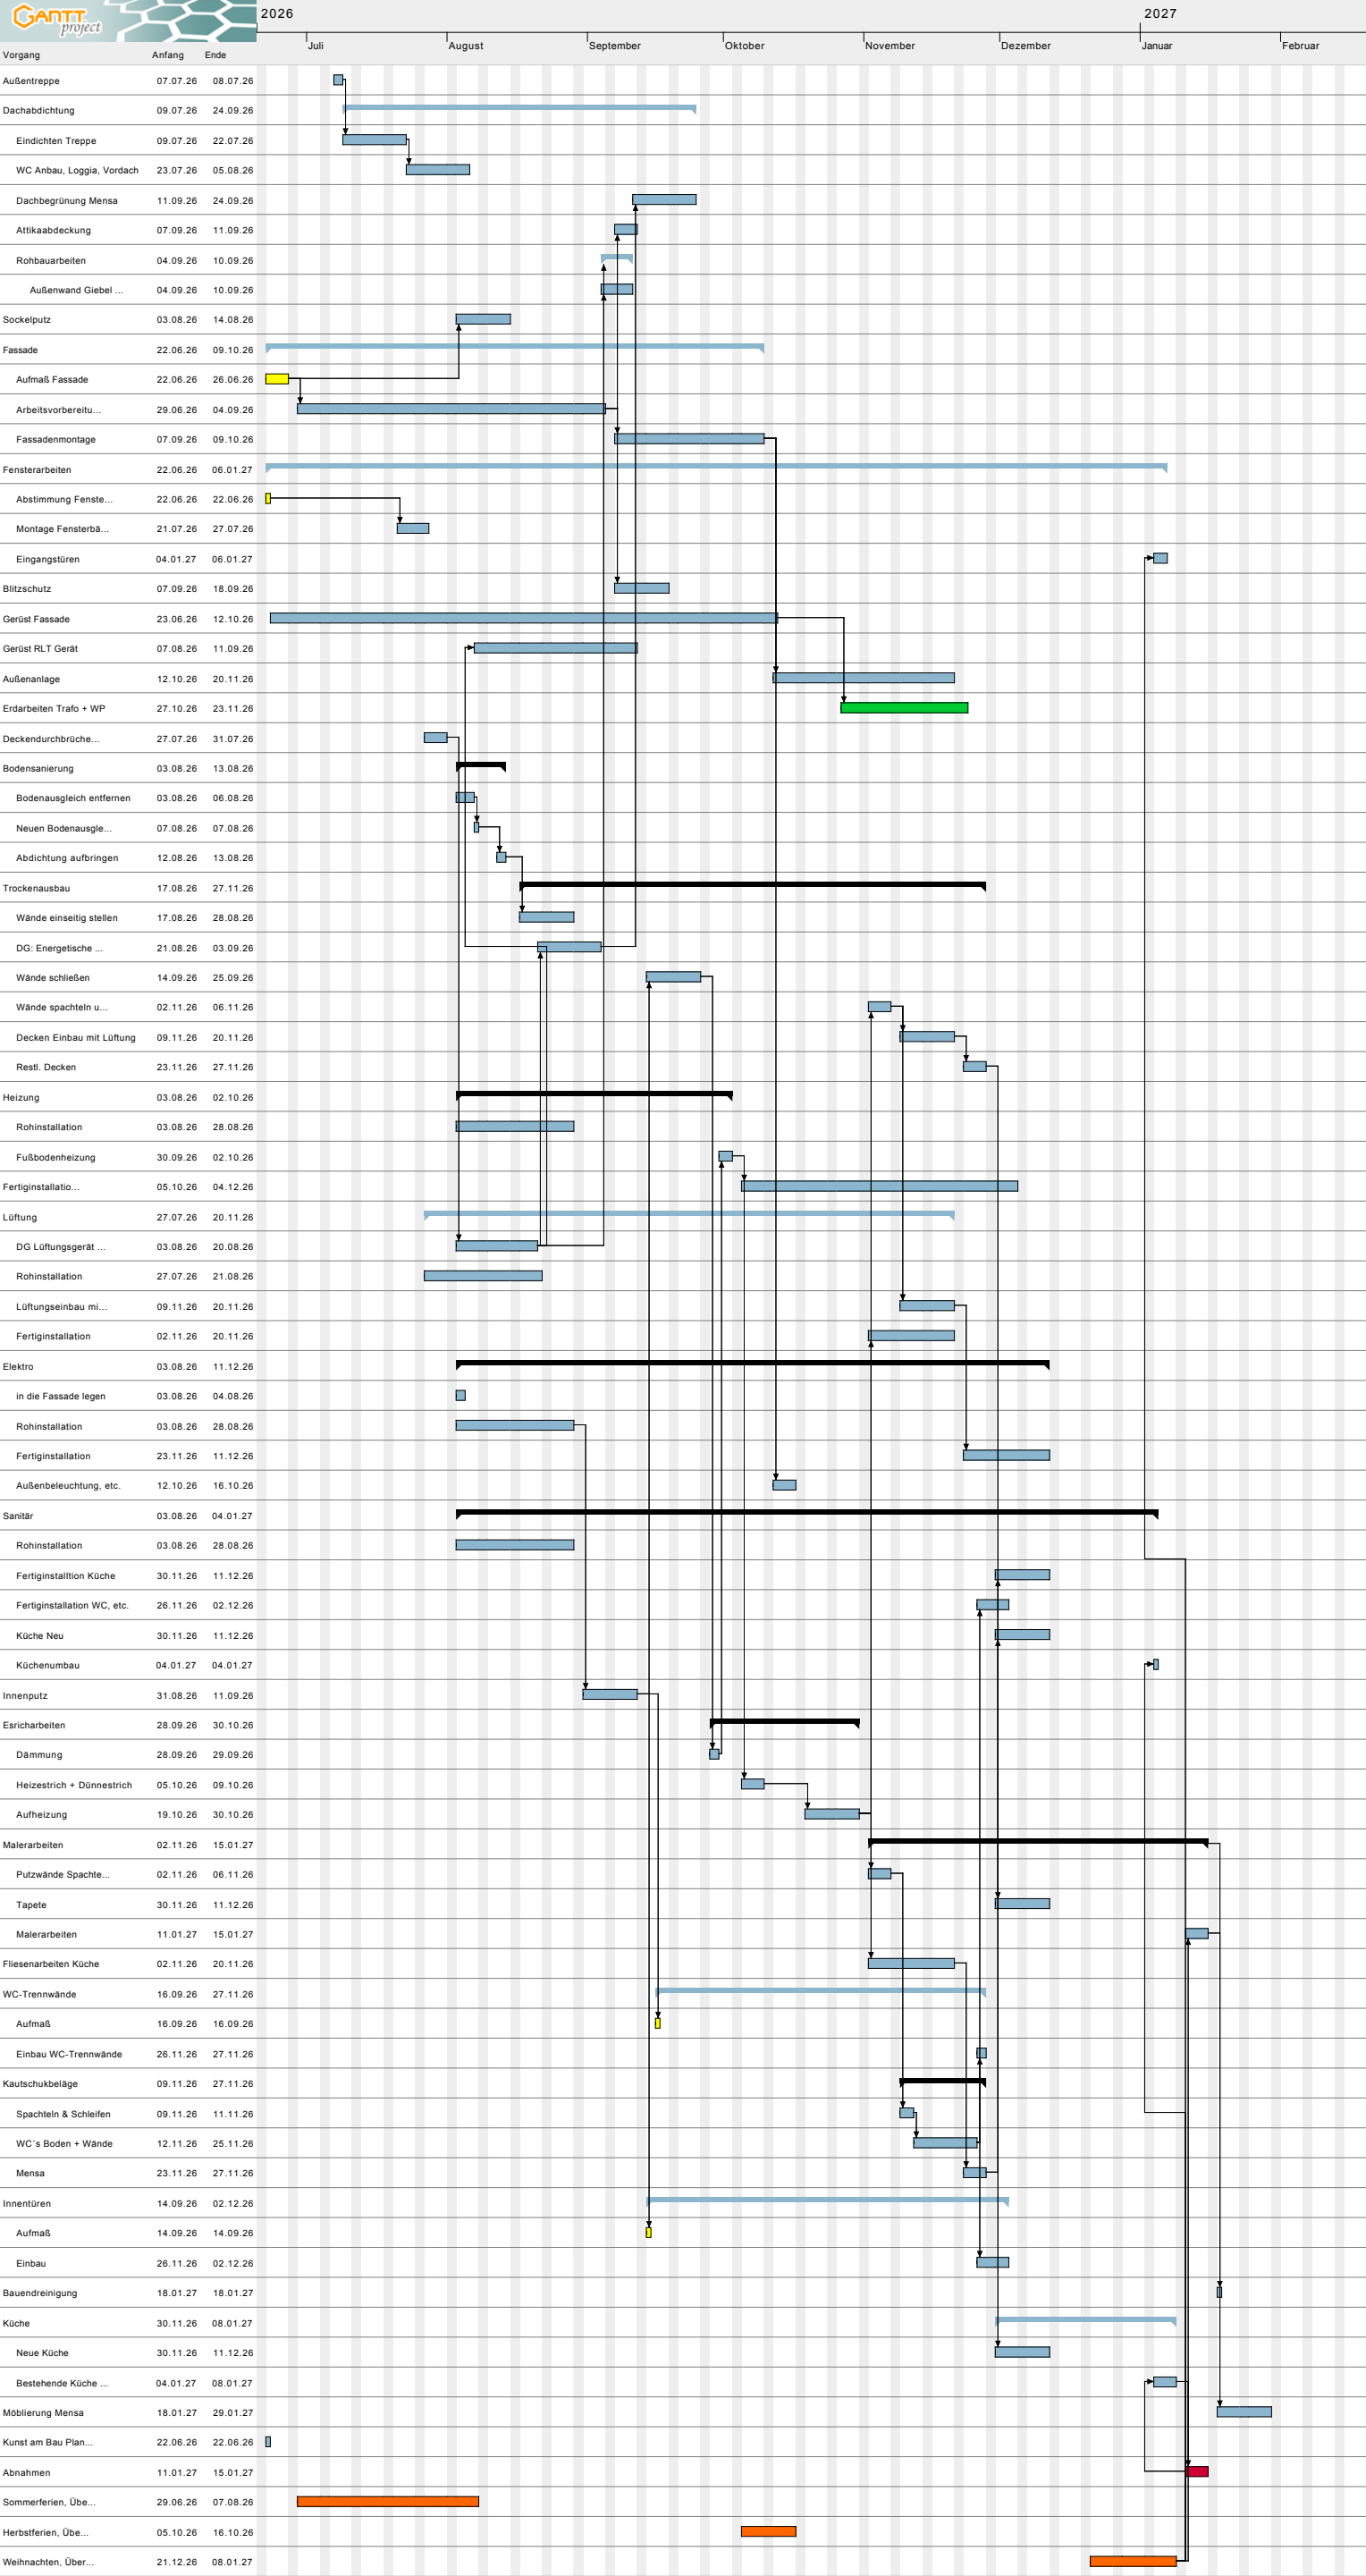

Ressourcendiagramm

