

Kanalsanierung Wallersheimer Weg

Übersicht Anschlussanbindung

Abschnitt	Straße	Haltungen	Dim / Mat.	Insp. Datum	Richtung	Entf.	Kürzel	öffnen	anbinden	Pos	Kürzeltext
SA 1	Wallersheimer Weg	008200151	DN 700/1050 MA	01.02.2024	in	0,00 m	BCD.XP				Anfangsknoten, Rohranfang
	Wallersheimer Weg	008200151	DN 700/1050 MA	01.02.2024	in	3,60 m	BCA.E.A	X	X	10 - 11	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008200151	DN 700/1050 MA	01.02.2024	in	12,20 m	BCA.F.B	-	-	10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008200151	DN 700/1050 MA	01.02.2024	in	12,50 m	BCA.F.B	-	-	2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008200151	DN 700/1050 MA	01.02.2024	in	21,50 m	BCA.E.A	X	X	12	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008200151	DN 700/1050 MA	01.02.2024	in	24,90 m	BCA.E.A	X	X	2	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008200151	DN 700/1050 MA	01.02.2024	in	25,00 m	BCA.F.B	-	-	10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008200151	DN 700/1050 MA	01.02.2024	in	28,70 m	BCA.E.A	X	X	10	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008200151	DN 700/1050 MA	01.02.2024	in	37,20 m	BCA.F.B	-	-	10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008200151	DN 700/1050 MA	01.02.2024	in	39,10 m	BCE.XP				Endknoten, Rohrende
Summe Abzweige geöffnet:						0		4	4		
Summe Abzweige verschlossen:						0					
Summe Stutzen geöffnet						4					
Summe Stutzen verschlossen						4					
Summe alle Anschlüsse						8					

Abschnitt	Straße	Haltungen	Dim / Mat.	Insp. Datum	Richtung	Entf.	Kürzel	5	anbinden	Pos	Kürzeltext
SA 2	Wallersheimer Weg	008201370	DN 700/1050 MA	01.02.2024	in	0,00 m	BCD.XP				Anfangsknoten, Rohranfang
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	10,90 m	BCA.F.B			2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	10,90 m	BCA.E.A	X	X	10	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	12,90 m	BCA.E.A	X	X	12	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	18,90 m	BCA.E.A	X	X	2	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	22,40 m	BCA.F.B			2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	22,40 m	BCA.F.B			10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	34,80 m	BCA.F.A	X	X	2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, offen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	34,80 m	BCA.F.B			10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	38,20 m	BCA.E.A	X	X	12	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	46,90 m	BCA.F.B			2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	46,90 m	BCA.F.B			10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	52,50 m	BCA.E.A	X	X	2	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	56,20 m	BCA.E.A	X	X	2	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	58,90 m	BCA.F.B			2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	58,90 m	BCA.F.B			10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	60,30 m	BCA.E.A	X	X	12	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	69,30 m	BCA.E.A	X	X	10	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	71,50 m	BCA.F.B			2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	71,60 m	BCA.F.B			10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	81,00 m	BCA.E.A	X (200)	X (200)	2	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	83,80 m	BCA.F.B			2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	83,80 m	BCA.F.B			10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	85,50 m	BCA.E.A	X	X	10	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	92,90 m	BCA.E.A	X	X	12	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	95,90 m	BCA.F.B			2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	95,90 m	BCA.F.B			10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	97,00 m	BCA.E.A	X (200)	X (200)	2	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	97,70 m	BCA.E.A	X	X	10	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	108,50 m	BCA.F.B			2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	108,50 m	BCA.F.B			10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201370		01.02.2024	in	119,70 m	BCE.XP				Endknoten, Rohrende
						Summe Abzweige geöffnet:	0				
						Summe Abzweige verschlossen:	0				
						Summe Stutzen geöffnet	14				
						Summe Stutzen verschlossen	16				
						Summe alle Anschlüsse	30				




Bezeichnung: 008201370GA01
Sanierungsleistung: Öffnen
Anbinden



Bezeichnung: 008201370RV01
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201370SE01
Sanierungsleistung: Öffnen
Anbinden

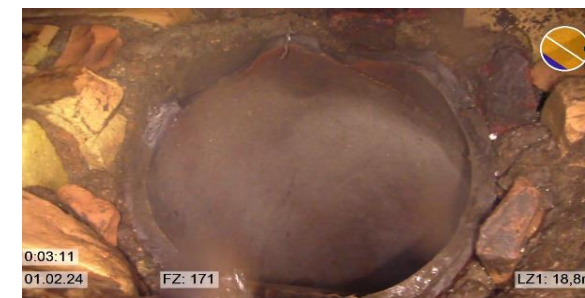

Bezeichnung: 008201370GA02
Sanierungsleistung: Öffnen
Anbinden



Bezeichnung: 008201370RV03
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201370RV02
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201370GA03
Sanierungsleistung: Öffnen
Anbinden



Bezeichnung: 008201370RV04
Sanierungsleistung: nicht öffnen




Bezeichnung: 008201370SE02
Sanierungsleistung: Öffnen
Anbinden



Bezeichnung: 008201370RV06
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201370RV05
Sanierungsleistung: nicht öffnen

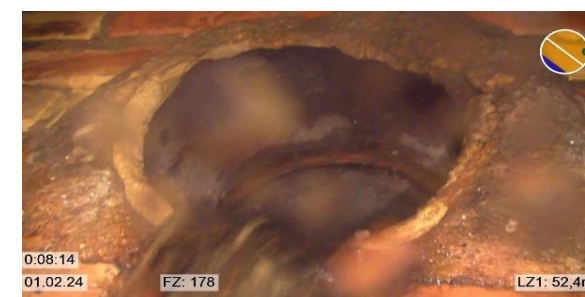

Bezeichnung: 008201370GA04
Sanierungsleistung: Öffnen
Anbinden



Bezeichnung: 008201370GA05
Sanierungsleistung: Öffnen
Anbinden



Bezeichnung: 008201370RV07
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201370RV08
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201370SE04
Sanierungsleistung: Öffnen
Anbinden



Bezeichnung: 008201370HR01
Sanierungsleistung: Öffnen
Anbinden



Bezeichnung: 008201370RV09
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201370RV10
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201370GA06
Sanierungsleistung: Öffnen
Anbinden



Bezeichnung: 008201370RV12
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201370RV11
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201370GA07
Sanierungsleistung: Öffnen
Anbinden



Bezeichnung: 008201370SE05
Sanierungsleistung: Öffnen
Anbinden



Bezeichnung: 008201370RV13
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201370RV14
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201370GA08
Sanierungsleistung: Öffnen
Anbinden



Bezeichnung: 008201370GA09
Sanierungsleistung: Öffnen
Anbinden



Bezeichnung: 008201370RV16
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201370RV15
Sanierungsleistung: nicht öffnen

Abschnitt	Straße	Haltungen	Dim / Mat.	Insp. Datum	Richtung	Entf.	Kürzel	öffnen	anbinden	Pos	Kürzeltext
SA 3	Wallersheimer Weg	008201380		01.02.2024	in	0,00 m	BCD.XP				Anfangsknoten, Rohranfang
	Wallersheimer Weg	008201380		01.02.2024	in	1,30 m	BCA.F.B	-	-	2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201380		01.02.2024	in	1,30 m	BCA.F.B	-	-	10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201380		01.02.2024	in	6,50 m	BCA.F.B	-	-	2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201380		01.02.2024	in	10,00 m	BCA.E.A	X	X	10	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008201380		01.02.2024	in	13,00 m	BCA.F.B	-	-	2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201380		01.02.2024	in	13,00 m	BCA.F.B	-	-	10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201380		01.02.2024	in	21,20 m	BCA.E.A	X	X	2	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008201380		01.02.2024	in	25,40 m	BCA.F.B	-	-	2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201380		01.02.2024	in	25,40 m	BCA.F.B	-	-	10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201380		01.02.2024	in	25,80 m	BCA.E.A	X	X	12	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008201380		01.02.2024	in	37,50 m	BCA.F.B	-	-	2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201380		01.02.2024	in	37,50 m	BCA.F.B	-	-	10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201380		01.02.2024	in	49,40 m	BCA.F.B	-	-	2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201380		01.02.2024	in	49,40 m	BCA.F.B	-	-	10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201380		01.02.2024	in	50,90 m	BCA.F.B	-	-	2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201380		01.02.2024	in	50,90 m	BCA.F.B	-	-	10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201380		01.02.2024	in	56,00 m	BCA.E.A	X	X	2	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008201380		01.02.2024	in	58,70 m	BCA.F.A	X	X	12	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, offen
	Wallersheimer Weg	008201380		01.02.2024	in	59,70 m	BCE.XP				Endknoten, Rohrende

Summe Abzweige geöffnet:	0
Summe Abzweige verschlossen:	0
Summe Stutzen geöffnet	5
Summe Stutzen verschlossen	13
Summe alle Anschlüsse	18



Bezeichnung: 008201380RV02
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201380RV01
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201380RV03
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201380GA01
Sanierungsleistung: Öffnen
Anbinden



Bezeichnung: 008201380RV04
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201380RV05
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201380GA01
Sanierungsleistung: Öffnen | DN 200
Anbinden



Bezeichnung: 008201380RV07
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201380RV06
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201380SE01
Sanierungsleistung: Öffnen |
Anbinden



Bezeichnung: 008201380RV08
Sanierungsleistung: nicht öffnen




Bezeichnung: 008201380RV09
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201380RV11
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201380RV10
Sanierungsleistung: nicht öffnen

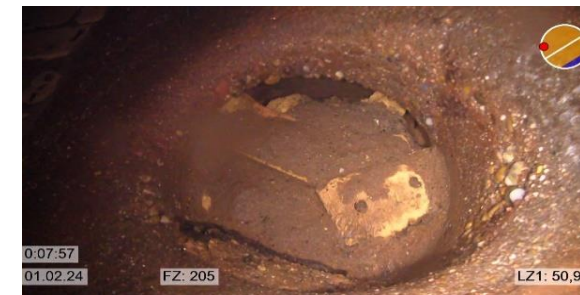

Bezeichnung: 008201380RV13
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201380RV12
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201380GA03
Sanierungsleistung: Öffnen | DN 200
Anbinden

Abschnitt	Straße	Haltungen	Dim / Mat.	Insp. Datum	Richtung	Entf.	Kürzel	öffnen	anbinden	Pos	Kürzeltext
SA 4	Wallersheimer Weg	008201390		01.02.2024	in	0,00 m	BCD.XP				Anfangsknoten, Rohranfang
	Wallersheimer Weg	008201390		01.02.2024	in	1,70 m	BCA.F.B	-	-	2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201390		01.02.2024	in	1,70 m	BCA.F.B	-	-	10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201390		01.02.2024	in	14,20 m	BCA.F.A	X	X	2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, offen
	Wallersheimer Weg	008201390		01.02.2024	in	14,20 m	BCA.F.A	X	X	10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, offen
	Wallersheimer Weg	008201390		01.02.2024	in	20,00 m	BCA.E.A	X	X	11	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008201390		01.02.2024	in	21,20 m	BCA.E.A	X	X	12 - 1	Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen
	Wallersheimer Weg	008201390		01.02.2024	in	26,20 m	BCA.F.B	-	-	2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201390		01.02.2024	in	26,20 m	BCA.F.B	-	-	10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201390		01.02.2024	in	36,80 m	BCA.F.B	-	-	2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201390		01.02.2024	in	36,80 m	BCA.F.B	-	-	10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201390		01.02.2024	in	38,20 m	BCA.F.B	-	-	2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201390		01.02.2024	in	38,20 m	BCA.F.B	-	-	10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201390		01.02.2024	in	50,00 m	BCA.F.B	-	-	2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201390		01.02.2024	in	50,00 m	BCA.F.B	-	-	10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201390		01.02.2024	in	59,30 m	BCE.XP				Endknoten, Rohrende

Summe Abzweige geöffnet:	0	4	4
Summe Abzweige verschlossen:	0		
Summe Stutzen geöffnet	4		
Summe Stutzen verschlossen	10		
Summe alle Anschlüsse	14		



Bezeichnung: 008201390RV01
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201390RV02
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201390GA02
Sanierungsleistung: Öffnen
Anbinden



Bezeichnung: 008201390GA01
Sanierungsleistung: Öffnen
Anbinden



Bezeichnung: 008201390GA04
Sanierungsleistung: Öffnen
Anbinden



Bezeichnung: 008201390SE01
Sanierungsleistung: Öffnen
Anbinden



Bezeichnung: 008201390RV04
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201390RV03
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201390RV05
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201390RV06
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201390RV08
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201390RV07
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201390RV09
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201390RV10
Sanierungsleistung: nicht öffnen

Abschnitt	Straße	Haltungen	Dim / Mat.	Insp. Datum	Richtung	Entf.	Kürzel	öffnen	anbinden	Pos	Kürzeltext
SA 5	Wallersheimer Weg	008201400		01.02.2024	gegen	0,00 m	BCD.XP				Anfangsknoten, Rohranfang
	Wallersheimer Weg	008201400		01.02.2024	gegen	7,40 m	BCA.F.B	-	-	10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201400		01.02.2024	gegen	7,50 m	BCA.F.B	-	-	2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201400		01.02.2024	gegen	15,00 m	BCA.F.B	-	-	2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201400		01.02.2024	gegen	15,00 m	BCA.F.B	-	-	10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201400		01.02.2024	gegen	27,30 m	BCA.F.B	-	-	2	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201400		01.02.2024	gegen	27,30 m	BCA.F.B	-	-	10	Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen
	Wallersheimer Weg	008201400		01.02.2024	gegen	30,60 m	BCE.XP				Endknoten, Rohrende

Summe Abzweige geöffnet:	0	0	0
Summe Abzweige verschlossen:	0		
Summe Stutzen geöffnet	0		
Summe Stutzen verschlossen	6		
Summe alle Anschlüsse	6		



Bezeichnung: 008201400RV01
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201400RV02
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201400RV03
Sanierungslei: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201400RV04
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201400RV05
Sanierungsleistung: nicht öffnen



Bezeichnung: 008201400RV06
Sanierungsleistung: nicht öffnen

Abschnitt	Straße	Haltungen	Dim / Mat.	Insp. Datum	Richtung	Entf.	Kürzel	öffnen	anbinden	Pos	Kürzeltext
SA 6	Wallersheimer Weg	008201570		01.02.2024	in	0,00 m	BCD.XP				Anfangsknoten, Rohranfang
	Wallersheimer Weg	008201570		01.02.2024	in	2,50 m	BCE.XP				Endknoten, Rohrende

Haltung hat keine Anschlüsse
