Projektnummer: 64

## Bauzeitenplan

# BV Grundschule - Erweiterung Mensa - Gensingen

| Pos | Vorgang | Dauer | Start | Ende |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Bauzeitenplan Grundschule Gensingen Stand: 15-05-2026** | | | |
| | | | | |
| 2 | Sommerferien RLP | 40kt | Mo, 29.06.26 | Fr, 07.08.26 |
| 3 | Herbstferien RLP | 12kt | Mo, 05.10.26 | Fr, 16.10.26 |
| 4 | Baubeginn | 1at | Mo, 03.08.26 | Mo, 03.08.26 |
| 5 | Dauer Rohbauarbeiten | 110kt | Mo, 03.08.26 | Fr, 20.11.26 |
| 6 | Rückbau der Außenanlage (Spielgeräte), Abbau der Pergolakonstruktion, Sträucher roden | 10at | Mo, 03.08.26 | Fr, 14.08.26 |
| 7 | Rückbau der vorhandenen Installationen (Lüftungsanlage, Kanäle, HLS, Elektro) | 5at | Mo, 10.08.26 | Fr, 14.08.26 |
| 8 | Gerüststellung für Dachabbruch und Vorhaltezeit | 20at | Mo, 10.08.26 | Fr, 04.09.26 |
| 5.1 | Baustelleneinrichtung, vorbereitende Arbeiten | 20at | Mo, 03.08.26 | Fr, 28.08.26 |
| 5.2 | Rückbau der bestehenden Dachkonstruktion, Notabdichtung Decke über EG | 20at | Mo, 17.08.26 | Fr, 11.09.26 |
| 5.3 | Wände Obergeschoss | 20at | Mo, 07.09.26 | Fr, 02.10.26 |
| 5.4 | Flachdachdecke + teilweise Attika über Obergeschoss | 20at | Mo, 05.10.26 | Fr, 30.10.26 |
| 5.5 | Restarbeiten Rohbau | 10at | Mo, 02.11.26 | Fr, 13.11.26 |
| 5.6 | Anpassungen / Ergänzungen Erdarbeiten Entwässerung | 10at | Mo, 09.11.26 | Fr, 20.11.26 |
| 9 | Gerüststellung und Vorhaltezeit | 100at | Mo, 16.11.26 | Fr, 02.04.27 |
| 10 | Flachdachabdichtung Dach über OG | 15at | Mo, 16.11.26 | Fr, 04.12.26 |
| 11 | seitliche Steildächer über OG | 10at | Mo, 23.11.26 | Fr, 04.12.26 |
| 12 | Fensterbauarbeiten - Aufmass u. Fertigung Fenster + Außentür | 30at | Mo, 05.10.26 | Fr, 13.11.26 |
| 13 | Fensterbauarbeiten - Einbau Fenster und Außentür | 15at | Mo, 16.11.26 | Fr, 04.12.26 |
| 14 | Fensterbauarbeiten - Einbau Alu-Innentüren | 10at | Mo, 08.03.27 | Fr, 19.03.27 |
| 15 | Aussenputz | 30at | Mo, 01.02.27 | Fr, 12.03.27 |
| 16 | Weihnachtsferien RLP | 17kt | Mi, 23.12.26 | Fr, 08.01.27 |
| 17 | Rohinstallationen - HLS | 25at | Mo, 26.10.26 | Fr, 27.11.26 |
| 18 | Rohinstallationen - EL | 25at | Mo, 26.10.26 | Fr, 27.11.26 |
| 19 | Einbau Speiseaufzug | 15at | Mo, 26.10.26 | Fr, 13.11.26 |
| 20 | Innenputzarbeiten | 10at | Mo, 07.12.26 | Fr, 18.12.26 |
| 21 | Estricharbeiten OG | 10at | Mo, 18.01.27 | Fr, 29.01.27 |
| 22 | Trockenzeit Estricharbeiten OG | 30at | Mo, 01.02.27 | Fr, 12.03.27 |
| 23 | Trockenbauarbeiten - Rückbau EG Abhang-Decke - | 10at | Mo, 03.08.26 | Fr, 14.08.26 |
| 24 | Trockenbauarbeiten - Abhang-Decke EG + OG | 15at | Mo, 08.02.27 | Fr, 26.02.27 |
| 25 | Osterferien RLP | 12kt | Mo, 22.03.27 | Fr, 02.04.27 |
| 26 | Malerarbeiten | 15at | Mo, 01.03.27 | Fr, 19.03.27 |
| 27 | Bodenbelagsarbeiten - Linoleum - Vinyl | 20at | Di, 23.03.27 | Mo, 19.04.27 |
| 28 | Malerarbeiten Beistreichen, Restanstriche | 15at | Mo, 19.04.27 | Fr, 07.05.27 |
| 29 | Fertiginstallation - HLS | 20at | Mo, 12.04.27 | Fr, 07.05.27 |
| 30 | Fertiginstallationen - EL | 20at | Mo, 12.04.27 | Fr, 07.05.27 |
| 31 | bewegliche Möbel - Montage durch Schulbetreiber | 10at | Mo, 14.06.27 | Fr, 25.06.27 |
| 32 | Einbaumöbel - Montage durch Schulbetreiber | 10at | Mo, 14.06.27 | Fr, 25.06.27 |
| 33 | Restarbeiten + Mängelbeseitigung | 15at | Mo, 07.06.27 | Fr, 25.06.27 |
| 34 | Schlosserarbeiten - Aufmass und Fertigung Fluchttreppe | 55at | Mo, 11.01.27 | Fr, 26.03.27 |
| 35 | Schlosserarbeiten - Montage Fluchttreppe | 15at | Mo, 29.03.27 | Fr, 16.04.27 |
| 36 | Außenanlagen (Spielflächen) durch Schulbetreiber | 24at | Mo, 19.04.27 | Do, 20.05.27 |
| 37 | Probelauf | 5at | Mo, 21.06.27 | Fr, 25.06.27 |
| 38 | Behördliche Abnahmen, Brandschutz, Bauamt | 5at | Mo, 21.06.27 | Fr, 25.06.27 |
| 39 | Sommerferien RLP | 40kt | Mo, 28.06.27 | Fr, 06.08.27 |

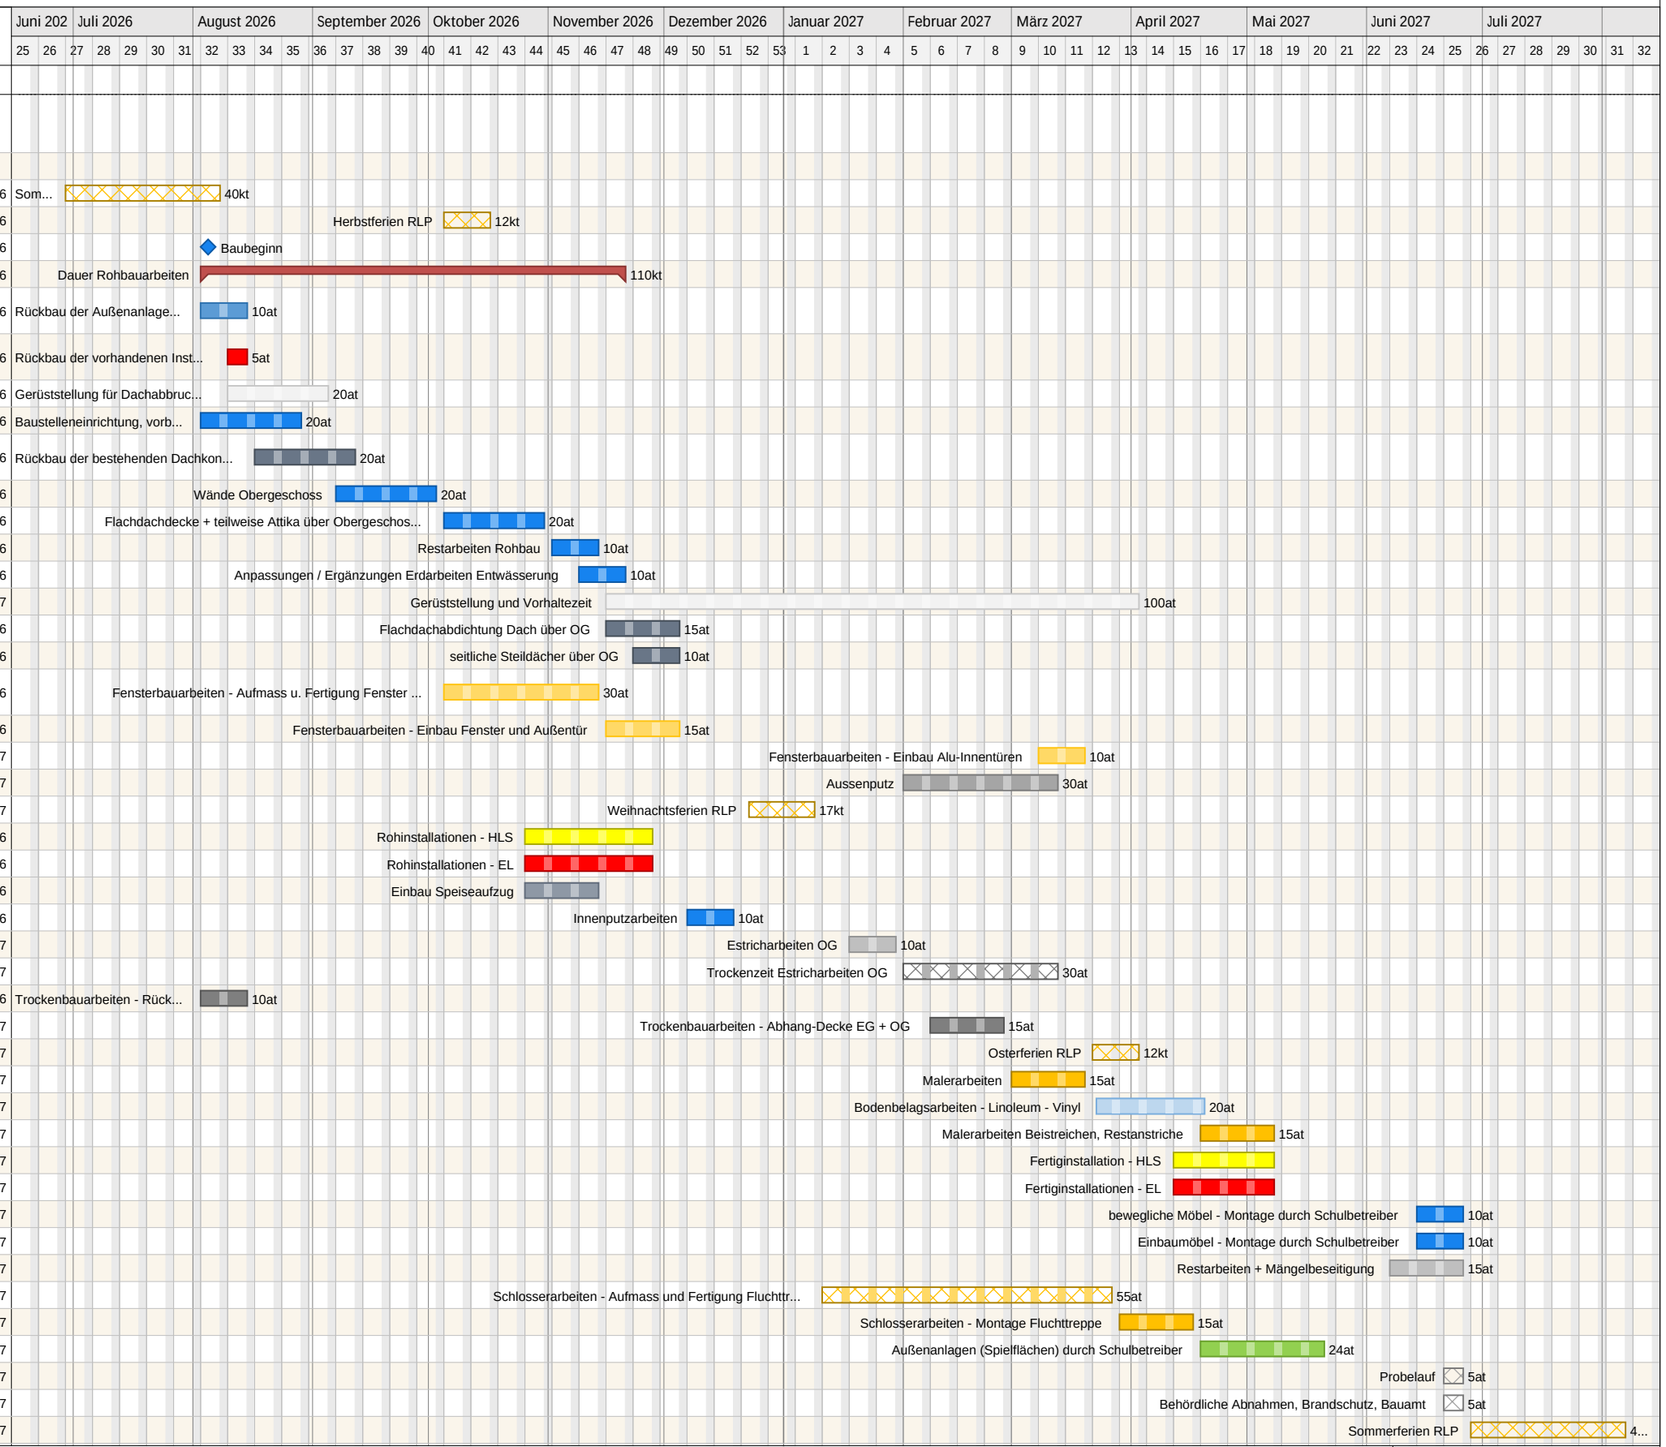


Projektzeitrahmen von Mo, 15.06.26 bis So, 15.08.27
Kalender: Rheinland-Pfalz (eingebettet)
Druckdatum: 22.05.2026 11:49
Filter:
Bearbeiter:

Förster & Förster Architekten GmbH
Neufelder Weg 69
D-55543 Bad Kreuznach
Tel. 0671-62044
Fax 0671-74094
e-Mail: g.foerster@foersterundfoerster.de

erstellt mit pro-Plan 6 (6.0.0.21) Seriennr.: 898 Lizenz für Förster & Förster Architekten GmbH, Bad Kreuznach
