AFRM Bauablaufplan Ausbau 2606724 (zur Veröffentlichung der LVs)
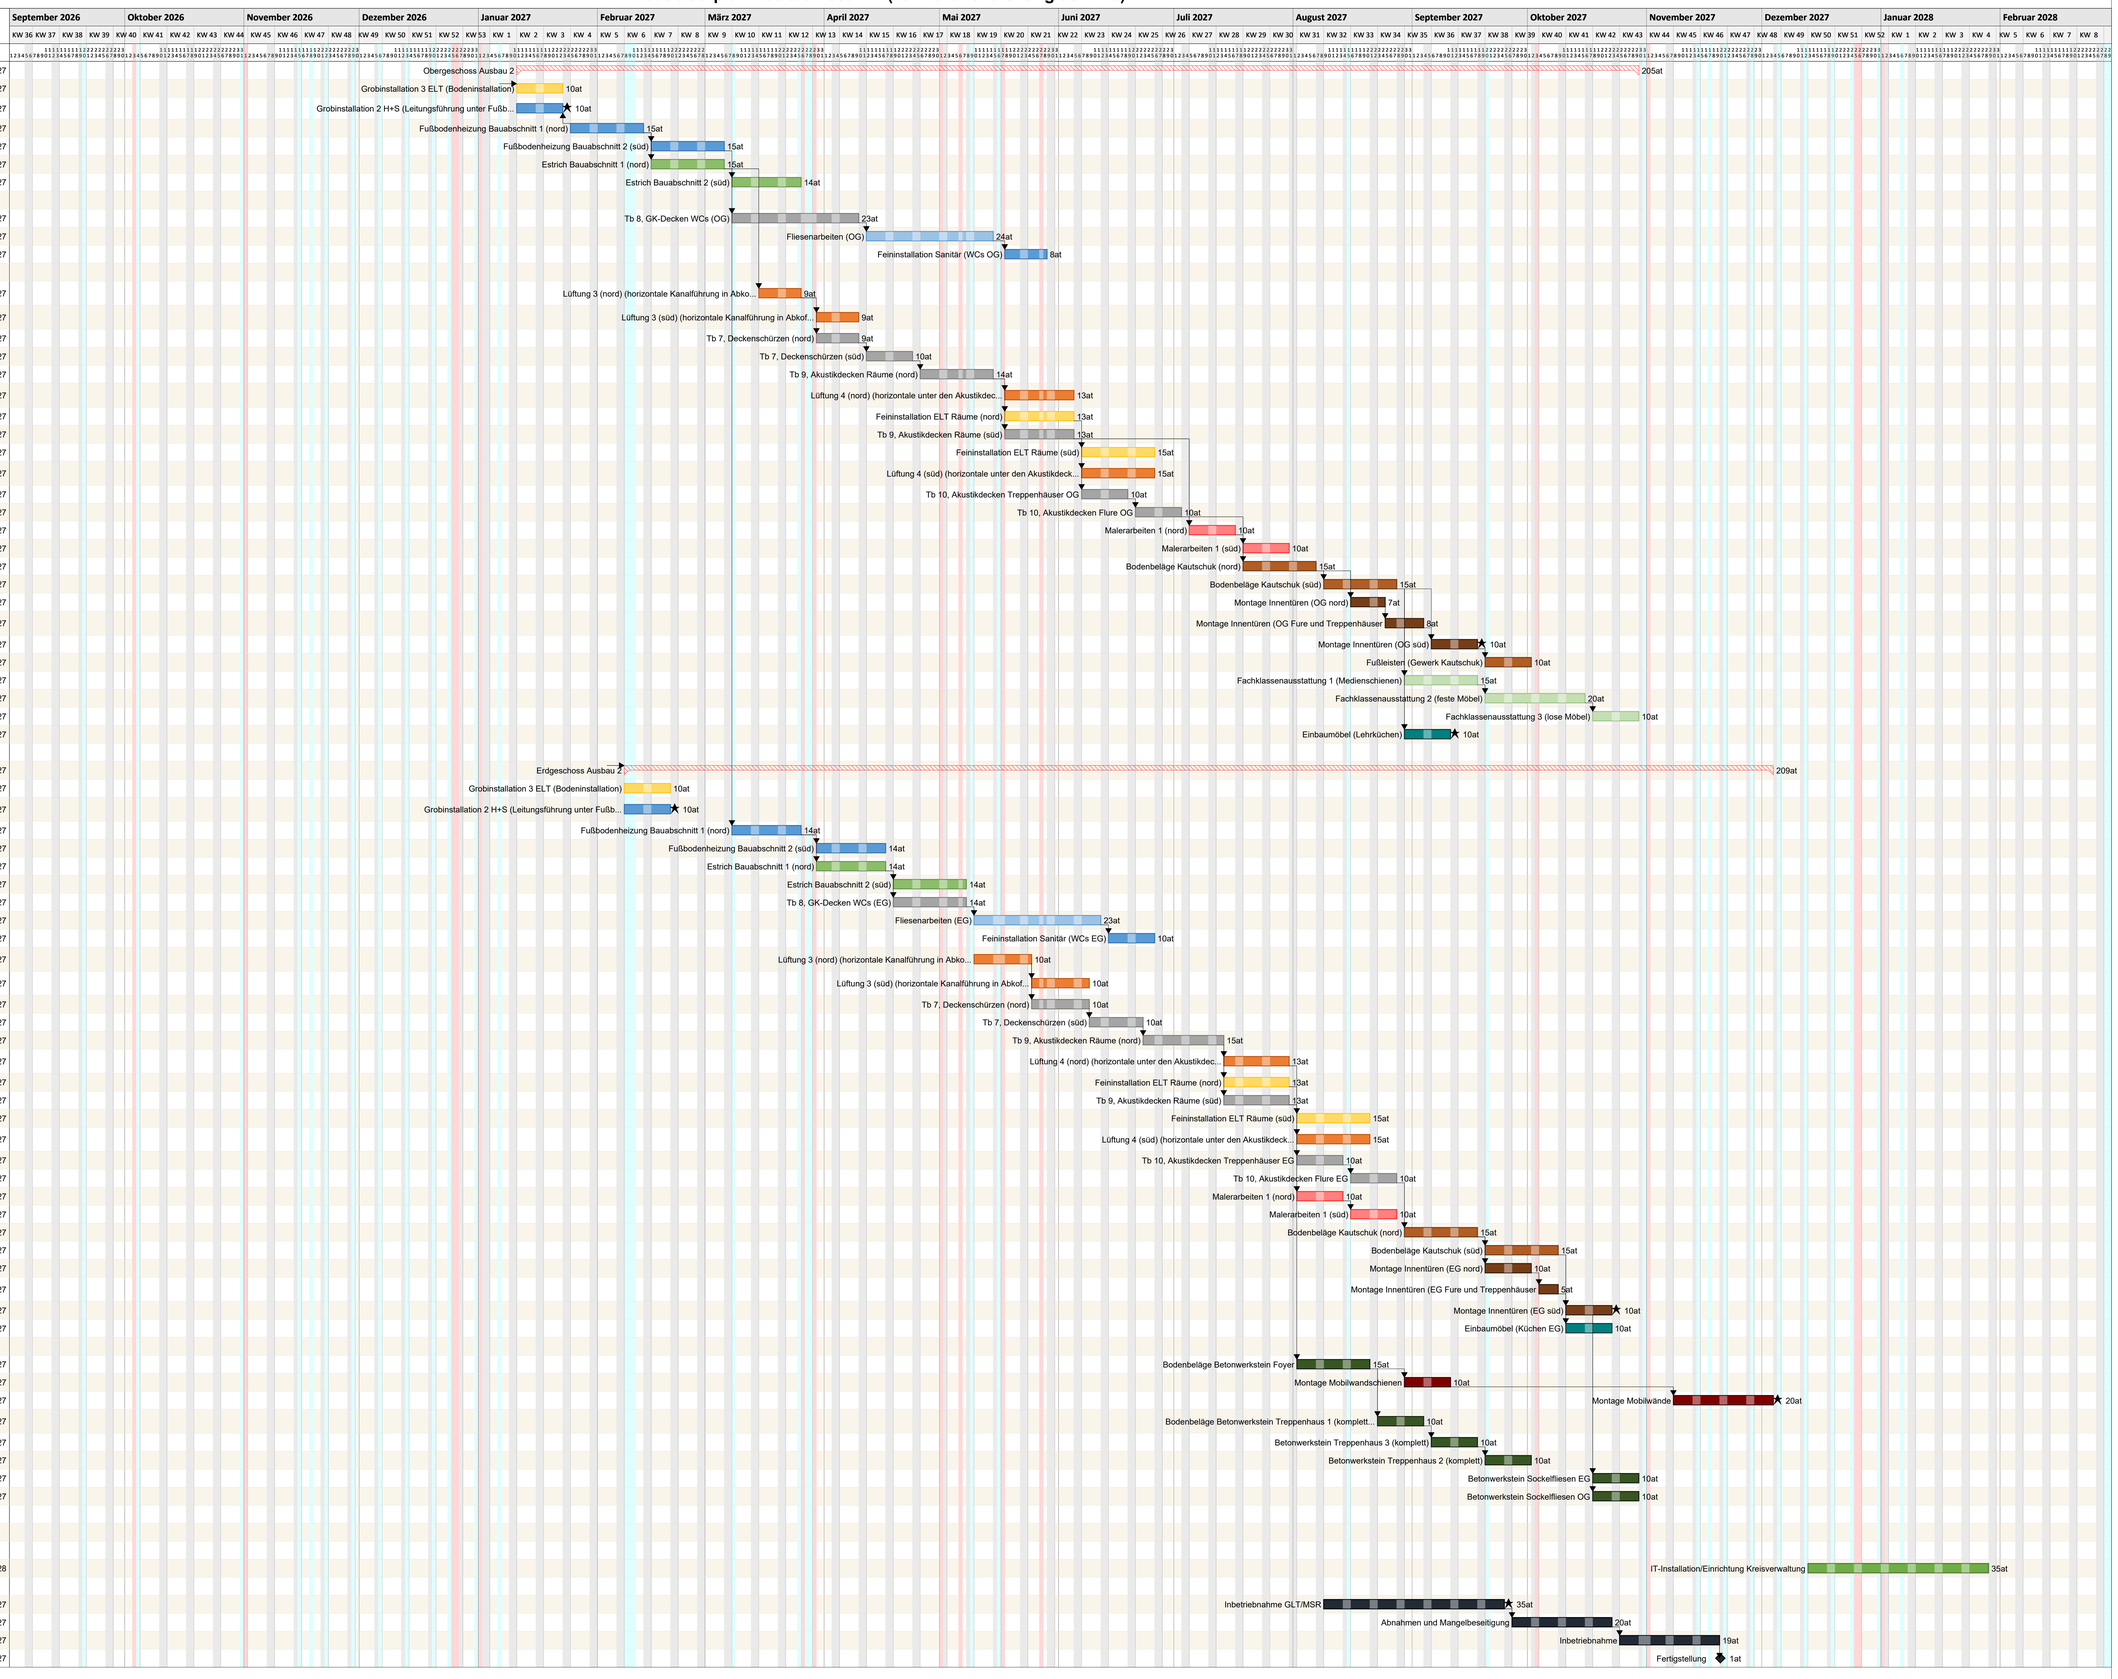
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
25	Obergeschoss Ausbau 2	205at	Mo, 11.01.27	Fr, 29.10.27
25.1	Grobinstallation 3 ELT (Bodeninstallation)	10at	Mo, 11.01.27	Fr, 22.01.27
25.2	Grobinstallation 2 H+S (Leitungsführung unter Fußboden)	10at	Mo, 11.01.27	Fr, 22.01.27
25.3	Fußbodenheizung Bauabschnitt 1 (nord)	15at	Mo, 25.01.27	Fr, 12.02.27
25.4	Fußbodenheizung Bauabschnitt 2 (süd)	15at	Mo, 15.02.27	Fr, 05.03.27
25.5	Estrich Bauabschnitt 1 (nord)	15at	Mo, 15.02.27	Fr, 05.03.27
25.6	Estrich Bauabschnitt 2 (süd)	14at	Mo, 08.03.27	Do, 25.03.27
25.7	Tb 8, GK-Decken WCs (OG)	23at	Mo, 08.03.27	Fr, 09.04.27
25.8	Fliesenarbeiten (OG)	24at	Mo, 12.04.27	Fr, 14.05.27
25.9	Feininstallation Sanitär (WCs OG)	8at	Di, 18.05.27	Fr, 28.05.27
25.10	Lüftung 3 (nord) (horizontale Kanalführung in Abkofferung)	9at	Mo, 15.03.27	Do, 25.03.27
25.11	Lüftung 3 (süd) (horizontale Kanalführung in Abkofferung)	9at	Di, 30.03.27	Fr, 09.04.27
25.12	Tb 7, Deckenschürzen (nord)	9at	Di, 30.03.27	Fr, 09.04.27
25.13	Tb 7, Deckenschürzen (süd)	10at	Mo, 12.04.27	Fr, 23.04.27
25.14	Tb 9, Akustikdecken Räume (nord)	14at	Mo, 26.04.27	Fr, 14.05.27
25.15	Lüftung 4 (nord) (horizontale unter den Akustikdecken in Räumen)	13at	Di, 18.05.27	Fr, 04.06.27
25.16	Feininstallation ELT Räume (nord)	13at	Di, 18.05.27	Fr, 04.06.27
25.17	Tb 9, Akustikdecken Räume (süd)	13at	Di, 18.05.27	Fr, 04.06.27
25.18	Feininstallation ELT Räume (süd)	15at	Mo, 07.06.27	Fr, 25.06.27
25.19	Lüftung 4 (süd) (horizontale unter den Akustikdecken in Räumen)	15at	Mo, 07.06.27	Fr, 25.06.27
25.20	Tb 10, Akustikdecken Treppenhäuser OG	10at	Mo, 07.06.27	Fr, 18.06.27
25.21	Tb 10, Akustikdecken Flure OG	10at	Mo, 21.06.27	Fr, 02.07.27
25.22	Malerarbeiten 1 (nord)	10at	Mo, 05.07.27	Fr, 16.07.27
25.23	Malerarbeiten 1 (süd)	10at	Mo, 19.07.27	Fr, 30.07.27
25.24	Bodenbeläge Kautschuk (nord)	15at	Mo, 19.07.27	Fr, 06.08.27
25.25	Bodenbeläge Kautschuk (süd)	15at	Mo, 09.08.27	Fr, 27.08.27
25.26	Montage Innentüren (OG nord)	7at	Mo, 16.08.27	Di, 24.08.27
25.27	Montage Innentüren (OG Fure und Treppenhäuser	8at	Mi, 25.08.27	Fr, 03.09.27
25.28	Montage Innentüren (OG süd)	10at	Mo, 06.09.27	Fr, 17.09.27
25.29	Fußleisten (Gewerk Kautschuk)	10at	Mo, 20.09.27	Fr, 01.10.27
25.30	Fachklassenausstattung 1 (Medienschienen)	15at	Mo, 30.08.27	Fr, 17.09.27
25.31	Fachklassenausstattung 2 (feste Möbel)	20at	Mo, 20.09.27	Fr, 15.10.27
25.32	Fachklassenausstattung 3 (lose Möbel)	10at	Mo, 18.10.27	Fr, 29.10.27
25.33	Einbaumöbel (Lehrküchen)	10at	Mo, 30.08.27	Fr, 10.09.27
26	Erdgeschoss Ausbau 2	209at	Mo, 08.02.27	Fr, 03.12.27
26.1	Grobinstallation 3 ELT (Bodeninstallation)	10at	Mo, 08.02.27	Fr, 19.02.27
26.2	Grobinstallation 2 H+S (Leitungsführung unter Fußboden)	10at	Mo, 08.02.27	Fr, 19.02.27
26.3	Fußbodenheizung Bauabschnitt 1 (nord)	14at	Mo, 08.03.27	Do, 25.03.27
26.4	Fußbodenheizung Bauabschnitt 2 (süd)	14at	Di, 30.03.27	Fr, 16.04.27
26.5	Estrich Bauabschnitt 1 (nord)	14at	Di, 30.03.27	Fr, 16.04.27
26.6	Estrich Bauabschnitt 2 (süd)	14at	Mo, 19.04.27	Fr, 07.05.27
26.7	Tb 8, GK-Decken WCs (EG)	14at	Mo, 19.04.27	Fr, 07.05.27
26.8	Fliesenarbeiten (EG)	23at	Mo, 10.05.27	Fr, 11.06.27
26.9	Feininstallation Sanitär (WCs EG)	10at	Mo, 14.06.27	Fr, 25.06.27
26.10	Lüftung 3 (nord) (horizontale Kanalführung in Abkofferung)	10at	Mo, 10.05.27	Mo, 24.05.27
26.11	Lüftung 3 (süd) (horizontale Kanalführung in Abkofferung)	10at	Di, 25.05.27	Di, 08.06.27
26.12	Tb 7, Deckenschürzen (nord)	10at	Di, 25.05.27	Di, 08.06.27
26.13	Tb 7, Deckenschürzen (süd)	10at	Mi, 09.06.27	Di, 22.06.27
26.14	Tb 9, Akustikdecken Räume (nord)	15at	Mi, 23.06.27	Di, 13.07.27
26.15	Lüftung 4 (nord) (horizontale unter den Akustikdecken in Räumen)	13at	Mi, 14.07.27	Fr, 30.07.27
26.16	Feininstallation ELT Räume (nord)	13at	Mi, 14.07.27	Fr, 30.07.27
26.17	Tb 9, Akustikdecken Räume (süd)	13at	Mi, 14.07.27	Fr, 30.07.27
26.18	Feininstallation ELT Räume (süd)	15at	Mo, 02.08.27	Fr, 20.08.27
26.19	Lüftung 4 (süd) (horizontale unter den Akustikdecken in Räumen)	15at	Mo, 02.08.27	Fr, 20.08.27
26.20	Tb 10, Akustikdecken Treppenhäuser EG	10at	Mo, 02.08.27	Fr, 13.08.27
26.21	Tb 10, Akustikdecken Flure EG	10at	Mo, 16.08.27	Fr, 27.08.27
26.22	Malerarbeiten 1 (nord)	10at	Mo, 02.08.27	Fr, 13.08.27
26.23	Malerarbeiten 1 (süd)	10at	Mo, 16.08.27	Fr, 27.08.27
26.24	Bodenbeläge Kautschuk (nord)	15at	Mo, 30.08.27	Fr, 17.09.27
26.25	Bodenbeläge Kautschuk (süd)	15at	Mo, 20.09.27	Fr, 08.10.27
26.26	Montage Innentüren (EG nord)	10at	Mo, 20.09.27	Fr, 01.10.27
26.27	Montage Innentüren (EG Fure und Treppenhäuser	5at	Mo, 04.10.27	Fr, 08.10.27
26.28	Montage Innentüren (EG süd)	10at	Mo, 11.10.27	Fr, 22.10.27
26.29	Einbaumöbel (Küchen EG)	10at	Mo, 11.10.27	Fr, 22.10.27
26.30	Bodenbeläge Betonwerkstein Foyer	15at	Mo, 02.08.27	Fr, 20.08.27
26.31	Montage Mobilwandschienen	10at	Mo, 30.08.27	Fr, 10.09.27
26.32	Montage Mobilwände	20at	Mo, 08.11.27	Fr, 03.12.27
26.33	Bodenbeläge Betonwerkstein Treppenhaus 1 (komplett)	10at	Mo, 23.08.27	Fr, 03.09.27
26.34	Betonwerkstein Treppenhaus 3 (komplett)	10at	Mo, 06.09.27	Fr, 17.09.27
26.35	Betonwerkstein Treppenhaus 2 (komplett)	10at	Mo, 20.09.27	Fr, 01.10.27
26.36	Betonwerkstein Sockelfliesen EG	10at	Mo, 18.10.27	Fr, 29.10.27
26.37	Betonwerkstein Sockelfliesen OG	10at	Mo, 18.10.27	Fr, 29.10.27
27	IT-Installation/Einrichtung Kreisverwaltung	35at	Mo, 13.12.27	Fr, 28.01.28
28	Inbetriebnahme GLT/MSR	35at	Mo, 09.08.27	Fr, 24.09.27
29	Abnahmen und Mangelbeseitigung	20at	Mo, 27.09.27	Fr, 22.10.27
30	Inbetriebnahme	19at	Mo, 25.10.27	Fr, 19.11.27
31	Fertigstellung	1at	Fr, 19.11.27	Fr, 19.11.27
