Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		**BLOCK A1 LPH6 Erstellung**	**50 Tage**	**Mon 14.04.25**	**Fre 20.06.25**
2		Spezialtiefbau-/Abfangarbeiten (Prio für Anfang HF)	50 Tage	Mon 14.04.25	Fre 20.06.25
3		**BLOCK A1 LPH7 Prüfung bis Beauftragung**	50 Tage	Mon 23.06.25	Fre 29.08.25
4		**BLOCK A2 LPH6 Erstellung**	**20 Tage**	**Mon 18.08.25**	**Fre 12.09.25**
5		Gerüstbau	20 Tage	Mon 18.08.25	Fre 12.09.25
6		Aufzug	10 Tage	Mon 01.09.25	Fre 12.09.25
7		BLOCK A2 LPH6 Abschluss	0 Tage	Fre 12.09.25	Fre 12.09.25
8		**BLOCK A2 LPH7 Prüfung bis Beauftragung**	70 Tage	Mon 15.09.25	Fre 19.12.25
9		**BLOCK A LPH8 Ausführung**	**125 Tage**	**Mon 13.10.25**	**Fre 03.04.26**
10		Spezialtiefbau-/Abfangarbeiten (Anfang SF)	85 Tage	Mon 13.10.25	Fre 06.02.26
11		Gerüstbau (fortlaufende Einrüstung mit Rohbau)	60 Tage	Mon 12.01.26	Fre 03.04.26
12		Aufzug Tiefbau/Unterfahrt/Vorinst.	20 Tage	Mon 12.01.26	Fre 06.02.26
13		**BLOCK B LPH6 Erstellung**	**20 Tage**	**Mon 15.09.25**	**Fre 10.10.25**
14		Abbruch und Prov. Verschluss	5 Tage	Mon 15.09.25	Fre 19.09.25
15		Rohbau (Fundamenterder etc. beachten)	15 Tage	Mon 22.09.25	Fre 10.10.25
16		Dachdecker	10 Tage	Mon 29.09.25	Fre 10.10.25
17		BLOCK B Abschluss	0 Tage	Fre 10.10.25	Fre 10.10.25
18		**BLOCK B LPH7 Prüfung bis Beauftragung**	70 Tage	Mon 13.10.25	Fre 16.01.26
19		**BLOCK B LPH8 Ausführung**	**140 Tage**	**Mon 09.03.26**	**Fre 18.09.26**
20		Abbruch und Prov. Verschluss	10 Tage	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26
21		Rohbau (Fundamenterder etc. beachten)	85 Tage	Mon 09.03.26	Fre 03.07.26
22		Dachdecker	45 Tage	Mon 06.07.26	Fre 04.09.26
23		**BLOCK C LPH6 Erstellung**	**30 Tage?**	**Mon 13.10.25**	**Fre 21.11.25**
24		Fassade (Metall, Grün, Kletterwand)	15 Tage	Mon 13.10.25	Fre 31.10.25
25		Fassade (Pfosten-Riegel) + Fenster	15 Tage	Mon 03.11.25	Fre 21.11.25
26		Fenster	10 Tage	Mon 10.11.25	Fre 21.11.25
27		Haupteingang	10 Tage	Mon 10.11.25	Fre 21.11.25
28		BLOCK C Abschluss	0 Tage	Fre 21.11.25	Fre 21.11.25
29		**BLOCK C LPH7 Prüfung bis Beauftragung**	70 Tage	Mon 24.11.25	Fre 27.02.26
30		**BLOCK C LPH8 Ausführung**	**95 Tage**	**Mon 29.06.26**	**Fre 06.11.26**
31		Fassade (Metall, Grün, Kletterwand)	90 Tage	Mon 06.07.26	Fre 06.11.26
32		Fassade (Pfosten-Riegel)	65 Tage	Mon 06.07.26	Fre 02.10.26
33		Fenster	30 Tage	Mon 07.09.26	Fre 16.10.26
34		Haupteingang	30 Tage	Mon 29.06.26	Fre 07.08.26
35		**BLOCK D LPH6 Erstellung**	**20 Tage**	**Mon 13.10.25**	**Fre 07.11.25**
36		Heizung	20 Tage	Mon 13.10.25	Fre 07.11.25
37		Lüftung	20 Tage	Mon 13.10.25	Fre 07.11.25
38		Sanitär	20 Tage	Mon 13.10.25	Fre 07.11.25
39		Elektro (inkl. PV-Anlage, ELA, BMA)	20 Tage	Mon 13.10.25	Fre 07.11.25
40		BLOCK C Abschluss	0 Tage	Fre 07.11.25	Fre 07.11.25
41		**BLOCK D LPH7 Prüfung bis Beauftragung**	80 Tage	Mon 10.11.25	Fre 27.02.26
42		**BLOCK D LPH8 Ausführung**	**160 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Fre 28.05.27**
43		Heizung, Lüftung, Sanitär	110 Tage	Mon 19.10.26	Fre 28.05.27
44		Elektro (inkl. PV-Anlage, ELA, BMA)	110 Tage	Mon 19.10.26	Fre 28.05.27
45		**BLOCK E LPH6 Erstellung**	**45 Tage**	**Mon 24.11.25**	**Fre 23.01.26**
46		Trockenbau + mob. Trennwände	10 Tage	Mon 24.11.25	Fre 05.12.25
47		Putzarbeiten	10 Tage	Mon 08.12.25	Fre 19.12.25
48		Brandschutzschottungen	10 Tage	Mon 22.12.25	Fre 02.01.26
49		Estrich	15 Tage	Mon 05.01.26	Fre 23.01.26
50		BLOCK D Abschluss	0 Tage	Fre 23.01.26	Fre 23.01.26
51		**BLOCK E LPH7 Prüfung bis Beauftragung**	70 Tage	Mon 26.01.26	Fre 01.05.26
52		**BLOCK E LPH8 Ausführung**	**130 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Fre 16.04.27**
53		Trockenbau + mob. Trennwände	55 Tage	Mon 19.10.26	Fre 01.01.27
54		Putzarbeiten	35 Tage	Mon 04.01.27	Fre 19.02.27
55		Brandschutzschottungen	20 Tage	Mon 22.02.27	Fre 19.03.27
56		Estrich	40 Tage	Mon 22.02.27	Fre 16.04.27
57		**BLOCK F LPH6 Erstellung**	**20 Tage**	**Mon 26.01.26**	**Fre 20.02.26**
58		Schreinerarbeiten (Innentüren + Fensterb.)	10 Tage	Mon 26.01.26	Fre 06.02.26
59		Metallbauarbeiten (Brandschutztüren + Schlosser)	10 Tage	Mon 09.02.26	Fre 20.02.26
60		BLOCK E Abschluss	0 Tage	Fre 20.02.26	Fre 20.02.26
61		**BLOCK F LPH7 Prüfung bis Beauftragung**	**70 Tage**	**Mon 23.02.26**	**Fre 29.05.26**
62		**BLOCK F LPH8 Ausführung**	**30 Tage**	**Mon 19.04.27**	**Fre 28.05.27**
63		Schreinerarbeiten (Innentüren + Fensterb.)	30 Tage	Mon 19.04.27	Fre 28.05.27
64		Metallbauarbeiten (Brandschutztüren + Schlosser)	20 Tage	Mon 19.04.27	Fre 14.05.27
65		**BLOCK G LPH6 Erstellung (Vorzug durch Lieferzeiten)**	**65 Tage**	**Mon 23.02.26**	**Fre 22.05.26**
66		Küche	65 Tage	Mon 23.02.26	Fre 22.05.26
67		Möblierung (inkl. Beschilderung)	65 Tage	Mon 23.02.26	Fre 22.05.26
68		BLOCK F Abschluss	0 Tage	Fre 22.05.26	Fre 22.05.26
69		**BLOCK G LPH7 Prüfung bis Beauftragung**	70 Tage	Mon 25.05.26	Fre 28.08.26
70		**BLOCK G LPH8 Ausführung**	**55 Tage**	**Mon 16.08.27**	**Fre 29.10.27**
71		Küche	55 Tage	Mon 16.08.27	Fre 29.10.27
72		Möblierung (inkl. Beschilderung)	55 Tage	Mon 16.08.27	Fre 29.10.27
73		**BLOCK H LPH6 Erstellung**	**30 Tage**	**Mon 25.05.26**	**Fre 03.07.26**
74		Bodenbeläge	10 Tage	Mon 25.05.26	Fre 05.06.26
75		Fliesen	10 Tage	Mon 08.06.26	Fre 19.06.26
76		Maler	10 Tage	Mon 22.06.26	Fre 03.07.26
77		BLOCK G Abschluss	0 Tage	Fre 03.07.26	Fre 03.07.26
78		**BLOCK H LPH7 Prüfung bis Beauftragung**	70 Tage	Mon 06.07.26	Fre 09.10.26
79		**BLOCK H LPH8 Ausführung**	**65 Tage**	**Mon 17.05.27**	**Fre 13.08.27**
80		Bodenbeläge	40 Tage	Mon 17.05.27	Fre 09.07.27
81		Fliesen	40 Tage	Mon 17.05.27	Fre 09.07.27
82		Maler	25 Tage	Mon 12.07.27	Fre 13.08.27
83		Schlosser	25 Tage	Mon 12.07.27	Fre 13.08.27
84		**BLOCK I LPH6 Erstellung**	**45 Tage**	**Mon 06.07.26**	**Fre 04.09.26**
85		Bauendreinigung	15 Tage	Mon 06.07.26	Fre 24.07.26
86		Außenanlagen	30 Tage	Mon 27.07.26	Fre 04.09.26
87		BLOCK H Abschluss	0 Tage	Fre 04.09.26	Fre 04.09.26
88		**BLOCK I LPH7 Prüfung bis Beauftragung**	70 Tage	Mon 07.09.26	Fre 11.12.26
89		**BLOCK I LPH8 Ausführung**	**60 Tage**	**Mon 27.09.27**	**Fre 17.12.27**
90		Bauendreinigung	15 Tage	Mon 29.11.27	Fre 17.12.27
91		Außenanlagen	60 Tage	Mon 27.09.27	Fre 17.12.27

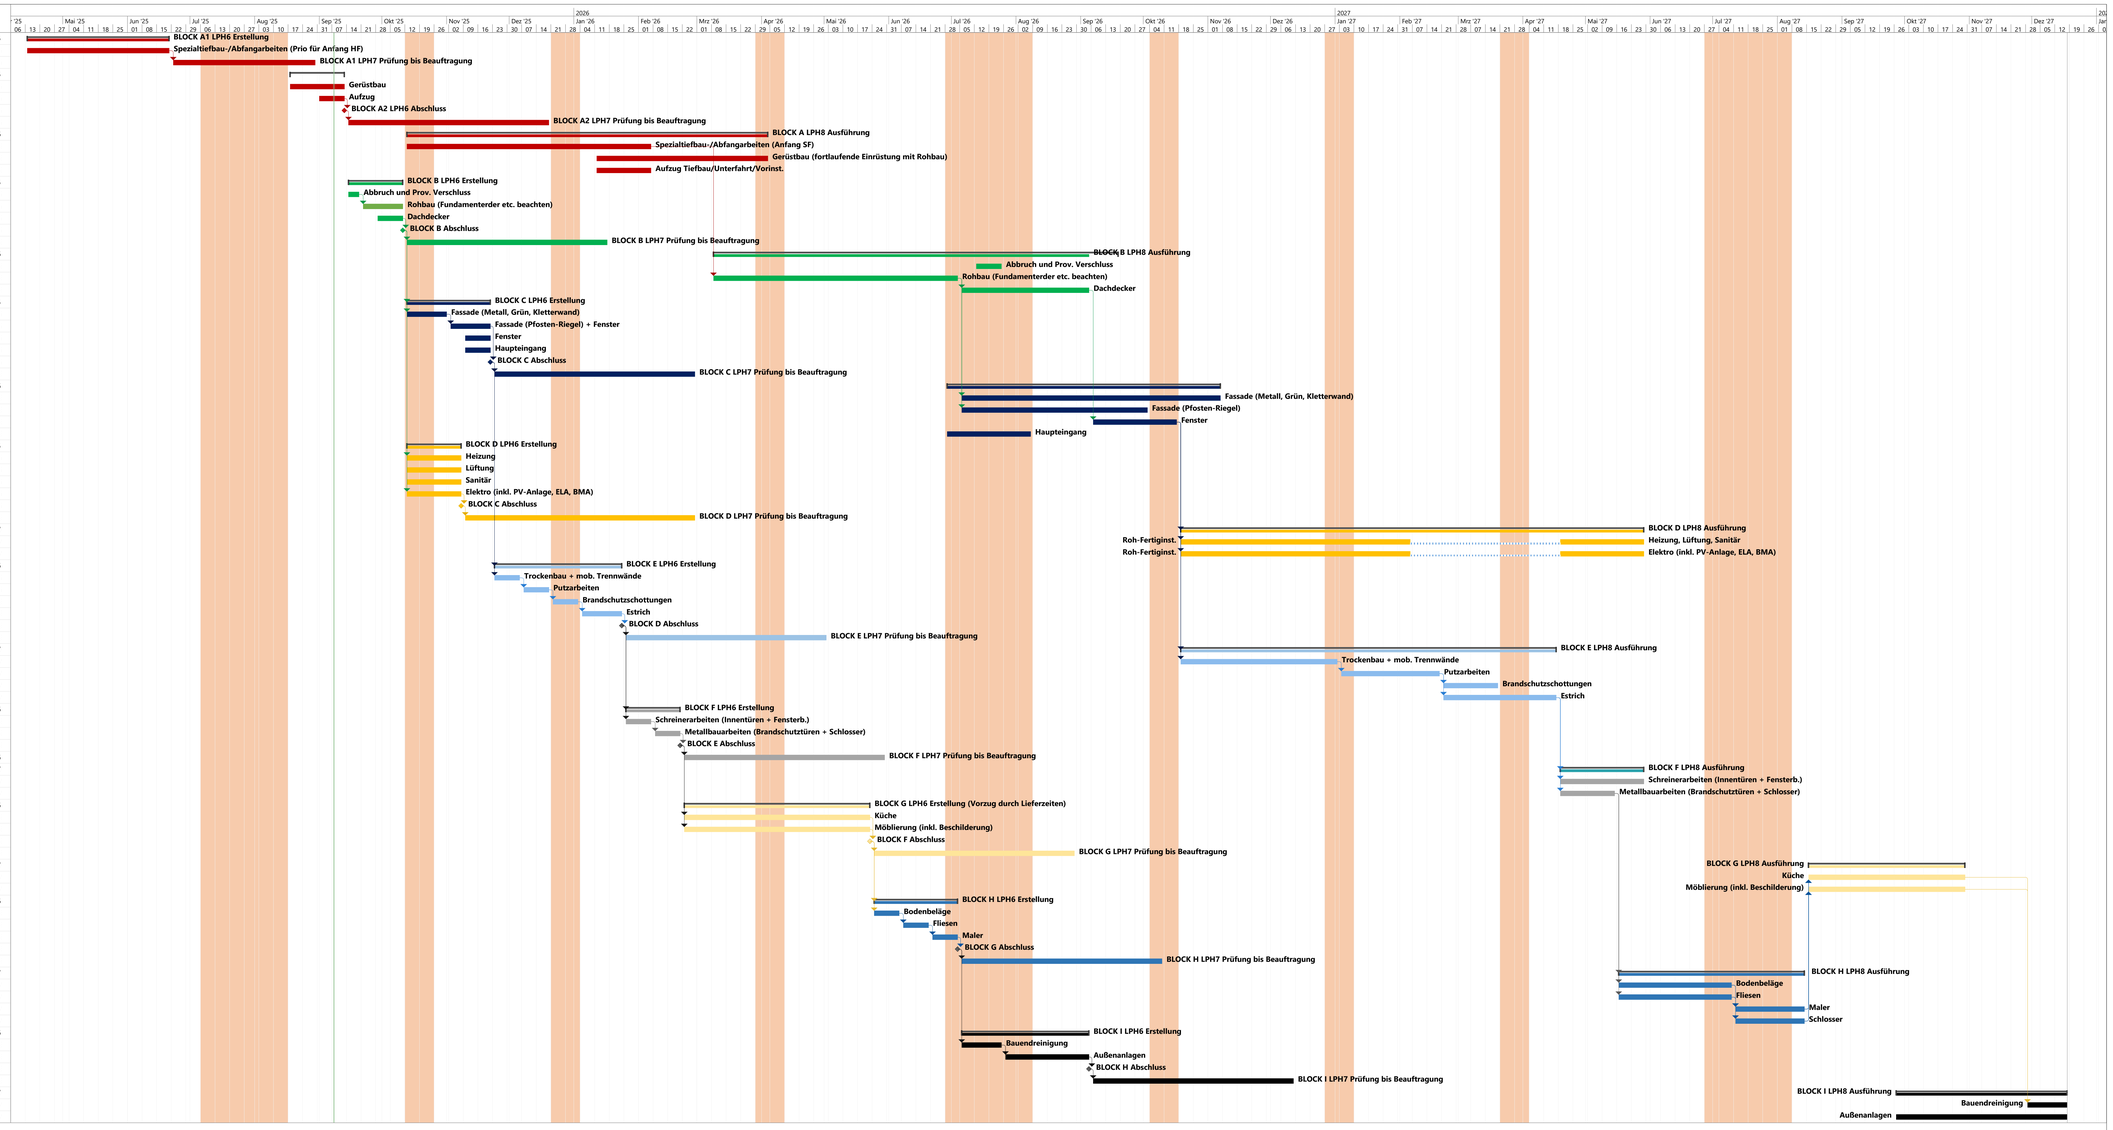

Project: CBS Vergabeterminplan
Date: Mon 08.09.25

Vorgang | Meilenstein | Sammelvorgang | Progress
