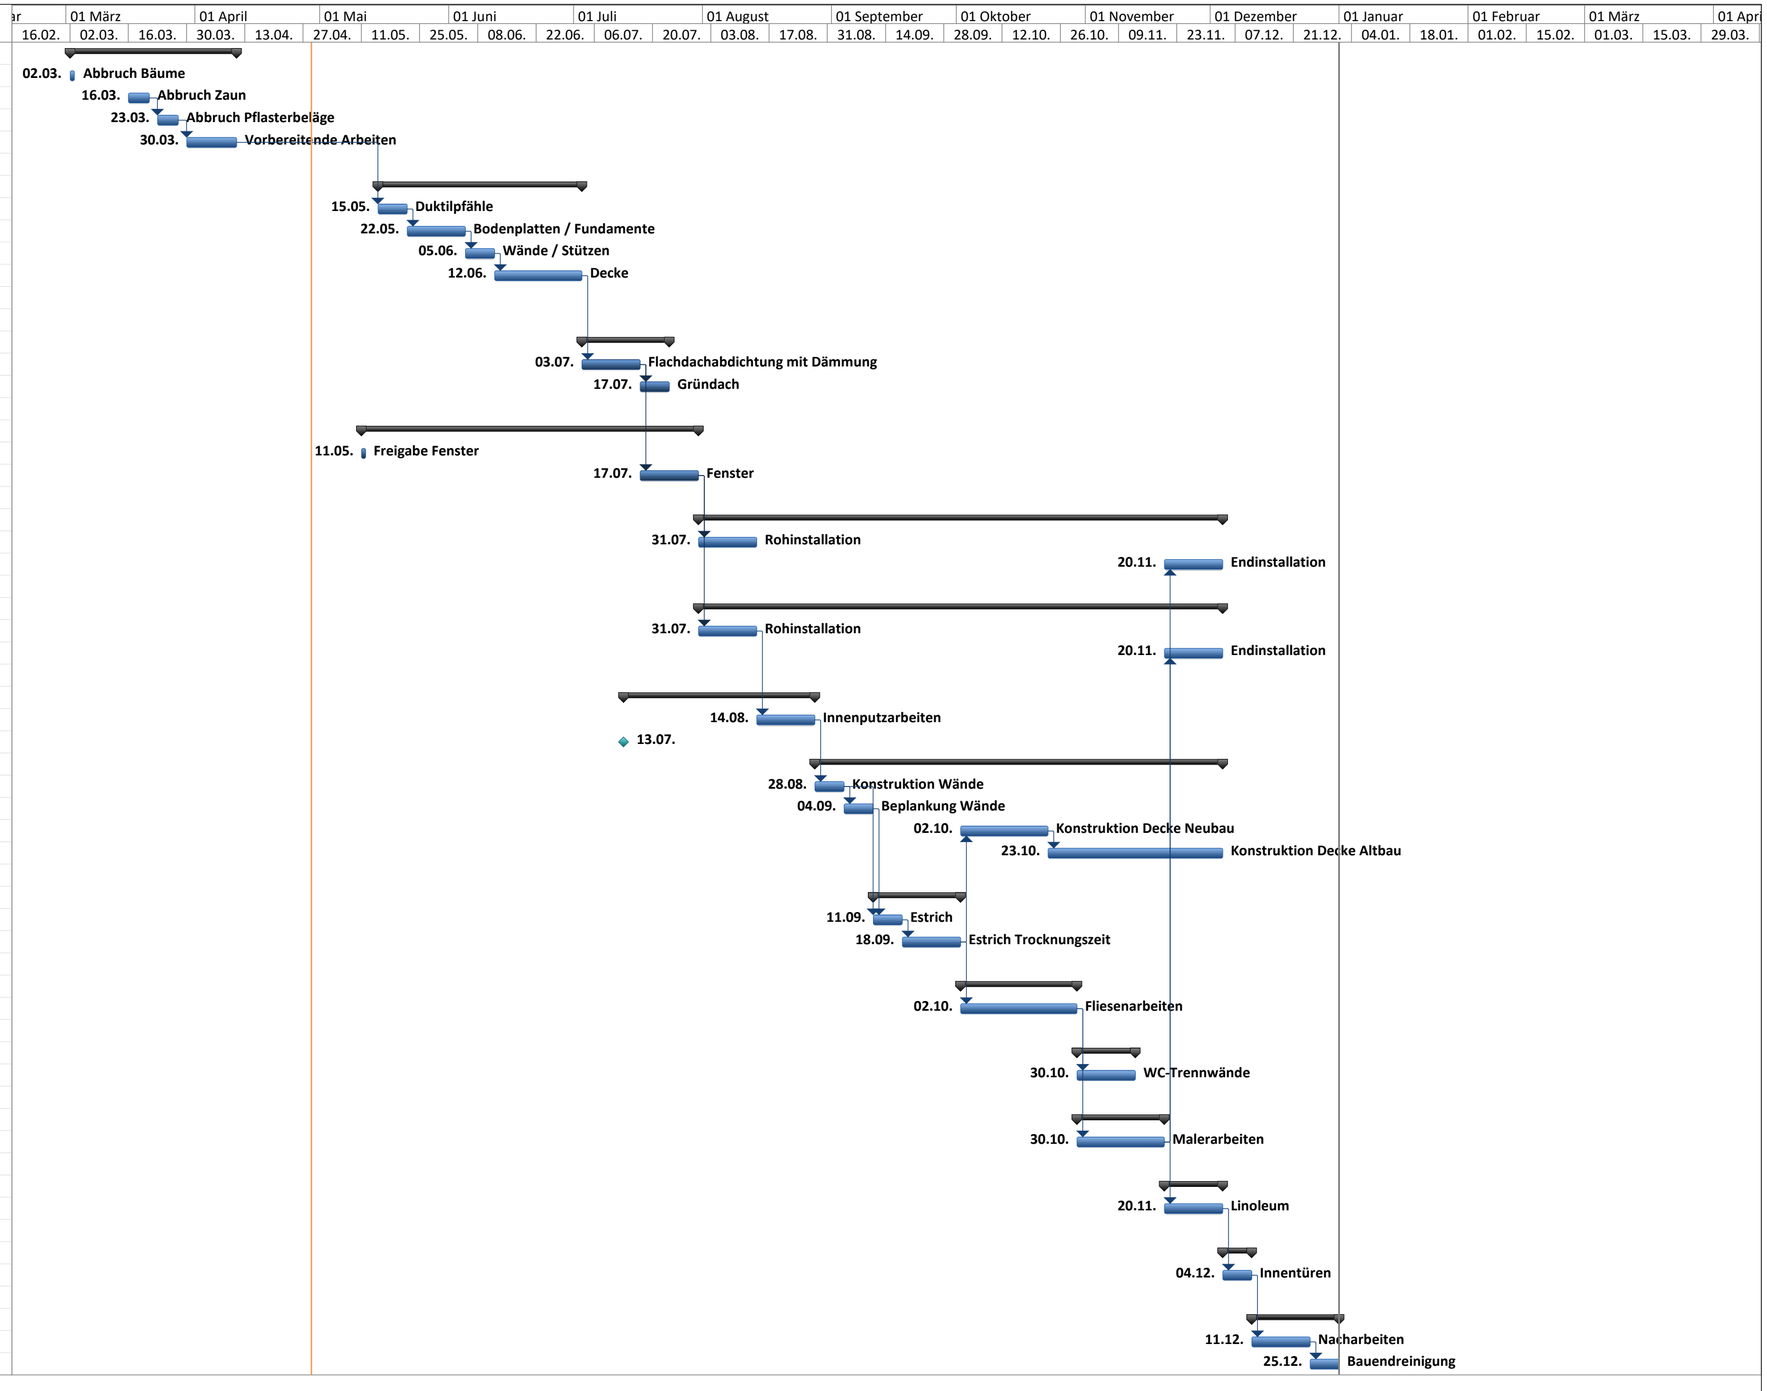Nr.	Vorgangsmodus	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
1		**Abbrucharbeiten**	**30 Tage**	**Mo 02.03.26**	**Fr 10.04.26**
2		Abbruch Bäume	1 Tag	Mo 02.03.26	Mo 02.03.26
3		Abbruch Zaun	5 Tage	Mo 16.03.26	Fr 20.03.26
4		Abbruch Pflasterbeläge	5 Tage	Mo 23.03.26	Fr 27.03.26
5		Vorbereitende Arbeiten	10 Tage	Mo 30.03.26	Fr 10.04.26
6					
7		**Rohbauarbeiten**	**35 Tage**	**Fr 15.05.26**	**Do 02.07.26**
8		Duktilpfähle	5 Tage	Fr 15.05.26	Do 21.05.26
9		Bodenplatten / Fundamente	10 Tage	Fr 22.05.26	Do 04.06.26
10		Wände / Stützen	5 Tage	Fr 05.06.26	Do 11.06.26
11		Decke	15 Tage	Fr 12.06.26	Do 02.07.26
12					
13					
14		**Dachdeckerarbeiten**	**15 Tage**	**Fr 03.07.26**	**Do 23.07.26**
15		Flachdachabdichtung mit Dämmung	10 Tage	Fr 03.07.26	Do 16.07.26
16		Gründach	5 Tage	Fr 17.07.26	Do 23.07.26
17					
18		**Fensterbauarbeiten**	**59 Tage**	**Mo 11.05.26**	**Do 30.07.26**
19		Freigabe Fenster	1 Tag	Mo 11.05.26	Mo 11.05.26
20		Fenster	10 Tage	Fr 17.07.26	Do 30.07.26
21					
22		**Elektroarbeiten**	**90 Tage**	**Fr 31.07.26**	**Do 03.12.26**
23		Rohinstallation	10 Tage	Fr 31.07.26	Do 13.08.26
24		Endinstallation	10 Tage	Fr 20.11.26	Do 03.12.26
25					
26		**Heizungs- und Sanitärarbeiten**	**90 Tage**	**Fr 31.07.26**	**Do 03.12.26**
27		Rohinstallation	10 Tage	Fr 31.07.26	Do 13.08.26
28		Endinstallation	10 Tage	Fr 20.11.26	Do 03.12.26
29					
30		**Innenputzarbeiten**	**34 Tage**	**Mo 13.07.26**	**Do 27.08.26**
31		Innenputzarbeiten	10 Tage	Fr 14.08.26	Do 27.08.26
32			0 Tage	Mo 13.07.26	Mo 13.07.26
33		**Trockenbauarbeiten**	**70 Tage**	**Fr 28.08.26**	**Do 03.12.26**
34		Konstruktion Wände	5 Tage	Fr 28.08.26	Do 03.09.26
35		Beplankung Wände	5 Tage	Fr 04.09.26	Do 10.09.26
36		Konstruktion Decke Neubau	15 Tage	Fr 02.10.26	Do 22.10.26
37		Konstruktion Decke Altbau	30 Tage	Fr 23.10.26	Do 03.12.26
38					
39		**Estricharbeiten**	**15 Tage**	**Fr 11.09.26**	**Do 01.10.26**
40		Estrich	5 Tage	Fr 11.09.26	Do 17.09.26
41		Estrich Trocknungszeit	10 Tage	Fr 18.09.26	Do 01.10.26
42					
43		**Fliesenarbeiten**	**20 Tage**	**Fr 02.10.26**	**Do 29.10.26**
44		Fliesenarbeiten	20 Tage	Fr 02.10.26	Do 29.10.26
45					
46		**Trennwände**	**10 Tage**	**Fr 30.10.26**	**Do 12.11.26**
47		WC-Trennwände	10 Tage	Fr 30.10.26	Do 12.11.26
48					
49		**Malerarbeiten**	**15 Tage**	**Fr 30.10.26**	**Do 19.11.26**
50		Malerarbeiten	15 Tage	Fr 30.10.26	Do 19.11.26
51					
52		**Bodenleger**	**10 Tage**	**Fr 20.11.26**	**Do 03.12.26**
53		Linoleum	10 Tage	Fr 20.11.26	Do 03.12.26
54					
55		**Innentüren**	**5 Tage**	**Fr 04.12.26**	**Do 10.12.26**
56		Innentüren	5 Tage	Fr 04.12.26	Do 10.12.26
57					
58		**Nacharbeiten**	**15 Tage**	**Fr 11.12.26**	**Do 31.12.26**
59		Nacharbeiten	10 Tage	Fr 11.12.26	Do 24.12.26
60		Bauendreinigung	5 Tage	Fr 25.12.26	Do 31.12.26
