Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	**Erdarbeiten**	**255 Ta...**	**Mon 13.10.25**	**Don 22.10.26**	
2	Baugrube	7 Tage	Mon 13.10.25	Die 21.10.25	
3	Baustellenzufahrt	3 Tage	Mit 22.10.25	Fre 24.10.25	2
4	Entwässerung ausserhalb Bodenplatte	5 Tage	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26	18
5	Stauraumkanal	7 Tage	Mit 14.10.26	Don 22.10.26	4EA-3 Tage
6	**Rohbauarbeiten**	**115 Tage**	**Mon 24.11.25**	**Die 19.05.26**	
7	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 24.11.25	Fre 28.11.25	
8	Stützwand und Fundamentierung	45 Tage	Mon 01.12.25	Mit 11.02.26	7
9	Bodenplatte	10 Tage	Don 12.02.26	Mit 25.02.26	8
10	Wände EG	22 Tage	Don 26.02.26	Fre 27.03.26	9
11	Decke über EG	13 Tage	Mon 30.03.26	Fre 17.04.26	10
12	Wände OG	7 Tage	Mon 20.04.26	Die 28.04.26	11
13	Decke über OG	7 Tage	Mit 29.04.26	Fre 08.05.26	12
14	Attikaaufkantungen	5 Tage	Die 12.05.26	Die 19.05.26	13EA+1 Tag
15	**Gerüst**	**132 Tage**	**Mit 01.04.26**	**Fre 09.10.26**	
16	Gerüst EG	2 Tage	Mit 01.04.26	Don 02.04.26	10EA+2 Tage
17	Gerüst OG	2 Tage	Don 30.04.26	Mon 04.05.26	12EA+1 Tag
18	Gerüstabbau	2 Tage	Don 08.10.26	Fre 09.10.26	33
19	**Holzbauarbeiten**	**13 Tage**	**Mon 08.06.26**	**Mit 24.06.26**	
20	Wände	5 Tage	Mon 08.06.26	Fre 12.06.26	
21	Decke	5 Tage	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26	20
22	Attika	3 Tage	Mon 22.06.26	Mit 24.06.26	21
23	**Dachdeckerarbeiten**	**30 Tage**	**Don 25.06.26**	**Mit 05.08.26**	
24	Dampfsperre	5 Tage	Don 25.06.26	Mit 01.07.26	22
25	Wärmedämmung	10 Tage	Don 02.07.26	Mit 15.07.26	24
26	Folienabdichtung	10 Tage	Don 16.07.26	Mit 29.07.26	25
27	Aattikaabdeckungen	5 Tage	Don 30.07.26	Mit 05.08.26	26
28	**Aluminiumfenster**	**15 Tage**	**Don 02.07.26**	**Mit 22.07.26**	
29	PR Konstruktion EG	10 Tage	Don 02.07.26	Mit 15.07.26	22EA+5 Tage
30	Alu Fenster OG	5 Tage	Don 16.07.26	Mit 22.07.26	29
31	**Fassade**	**45 Tage**	**Don 06.08.26**	**Mit 07.10.26**	**30**
32	Wärmedämmung und UK	20 Tage	Don 06.08.26	Mit 02.09.26	27
33	vorgeh. hinterl. Fassadenplatten	25 Tage	Don 03.09.26	Mit 07.10.26	32
34	**Trockenbau**	**124 Tage?**	**Mon 27.07.26**	**Fre 22.01.27**	
35	Wände einseitig EG	5 Tage	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26	30EA+2 Tage
36	Wände einseitig OG	1 Tag?	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26	35
37	Wände schliessen	30 Tage	Fre 11.09.26	Don 22.10.26	42
38	Decke EG	20 Tage	Fre 23.10.26	Don 19.11.26	37
39	Decke OG	15 Tage	Fre 13.11.26	Don 03.12.26	38EA-5 Tage
40	Innentüren	5 Tage	Mon 18.01.27	Fre 22.01.27	66
41	**Elektro**	**125 Tage**	**Fre 07.08.26**	**Fre 05.02.27**	
42	Rohinst	25 Tage	Fre 07.08.26	Don 10.09.26	35EA+4 Tage
43	Fertiginst	13 Tage	Mon 18.01.27	Mit 03.02.27	66
44	Inbetriebnahme	2 Tage	Don 04.02.27	Fre 05.02.27	43
45	**Heizung**	**120 Tage?**	**Mon 03.08.26**	**Mon 25.01.27**	
46	Rohinst	20 Tage	Mon 03.08.26	Fre 28.08.26	35
47	Fussbodenheizung	5 Tage	Fre 23.10.26	Don 29.10.26	37
48	Fertiginst	5 Tage	Mon 18.01.27	Fre 22.01.27	66
49	Inbetriebnahme	1 Tag?	Mon 25.01.27	Mon 25.01.27	48
50	**Sanitär**	**119 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Fre 22.01.27**	
51	Rohinst	15 Tage	Mon 03.08.26	Fre 21.08.26	35
52	Ferttginst.	5 Tage	Mon 18.01.27	Fre 22.01.27	66
53	**Lüftung**	**119 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Fre 22.01.27**	
54	Rohinst.	20 Tage	Mon 03.08.26	Fre 28.08.26	35
55	Fertiginst.	5 Tage	Mon 18.01.27	Fre 22.01.27	66
56	**Innenputz nass**	**8 Tage**	**Fre 11.09.26**	**Die 22.09.26**	
57	EG	5 Tage	Fre 11.09.26	Don 17.09.26	42
58	OG	3 Tage	Fre 18.09.26	Die 22.09.26	57
59	**Estrich**	**4 Tage**	**Fre 30.10.26**	**Mit 04.11.26**	
60	OG	2 Tage	Fre 30.10.26	Mon 02.11.26	47
61	EG	2 Tage	Die 03.11.26	Mit 04.11.26	60
62	**Fliesen**	**26 Tage**	**Don 19.11.26**	**Fre 01.01.27**	
63	OG	6 Tage	Don 19.11.26	Don 26.11.26	60EA+12 Tage
64	EG	20 Tage	Fre 27.11.26	Fre 01.01.27	63
65	**Bodenbeläge Klassenrä**	10 Tage	Fre 27.11.26	Don 10.12.26	63
66	**Malerarbeiten**	20 Tage	Fre 11.12.26	Fre 15.01.27	65
67	**Einbaumöbel**	10 Tage	Mon 18.01.27	Fre 29.01.27	66
68	**lose Möbel**	5 Tage	Mon 01.02.27	Fre 05.02.27	67
69	**Aussenanlagen**	25 Tage	Fre 23.10.26	Don 26.11.26	5

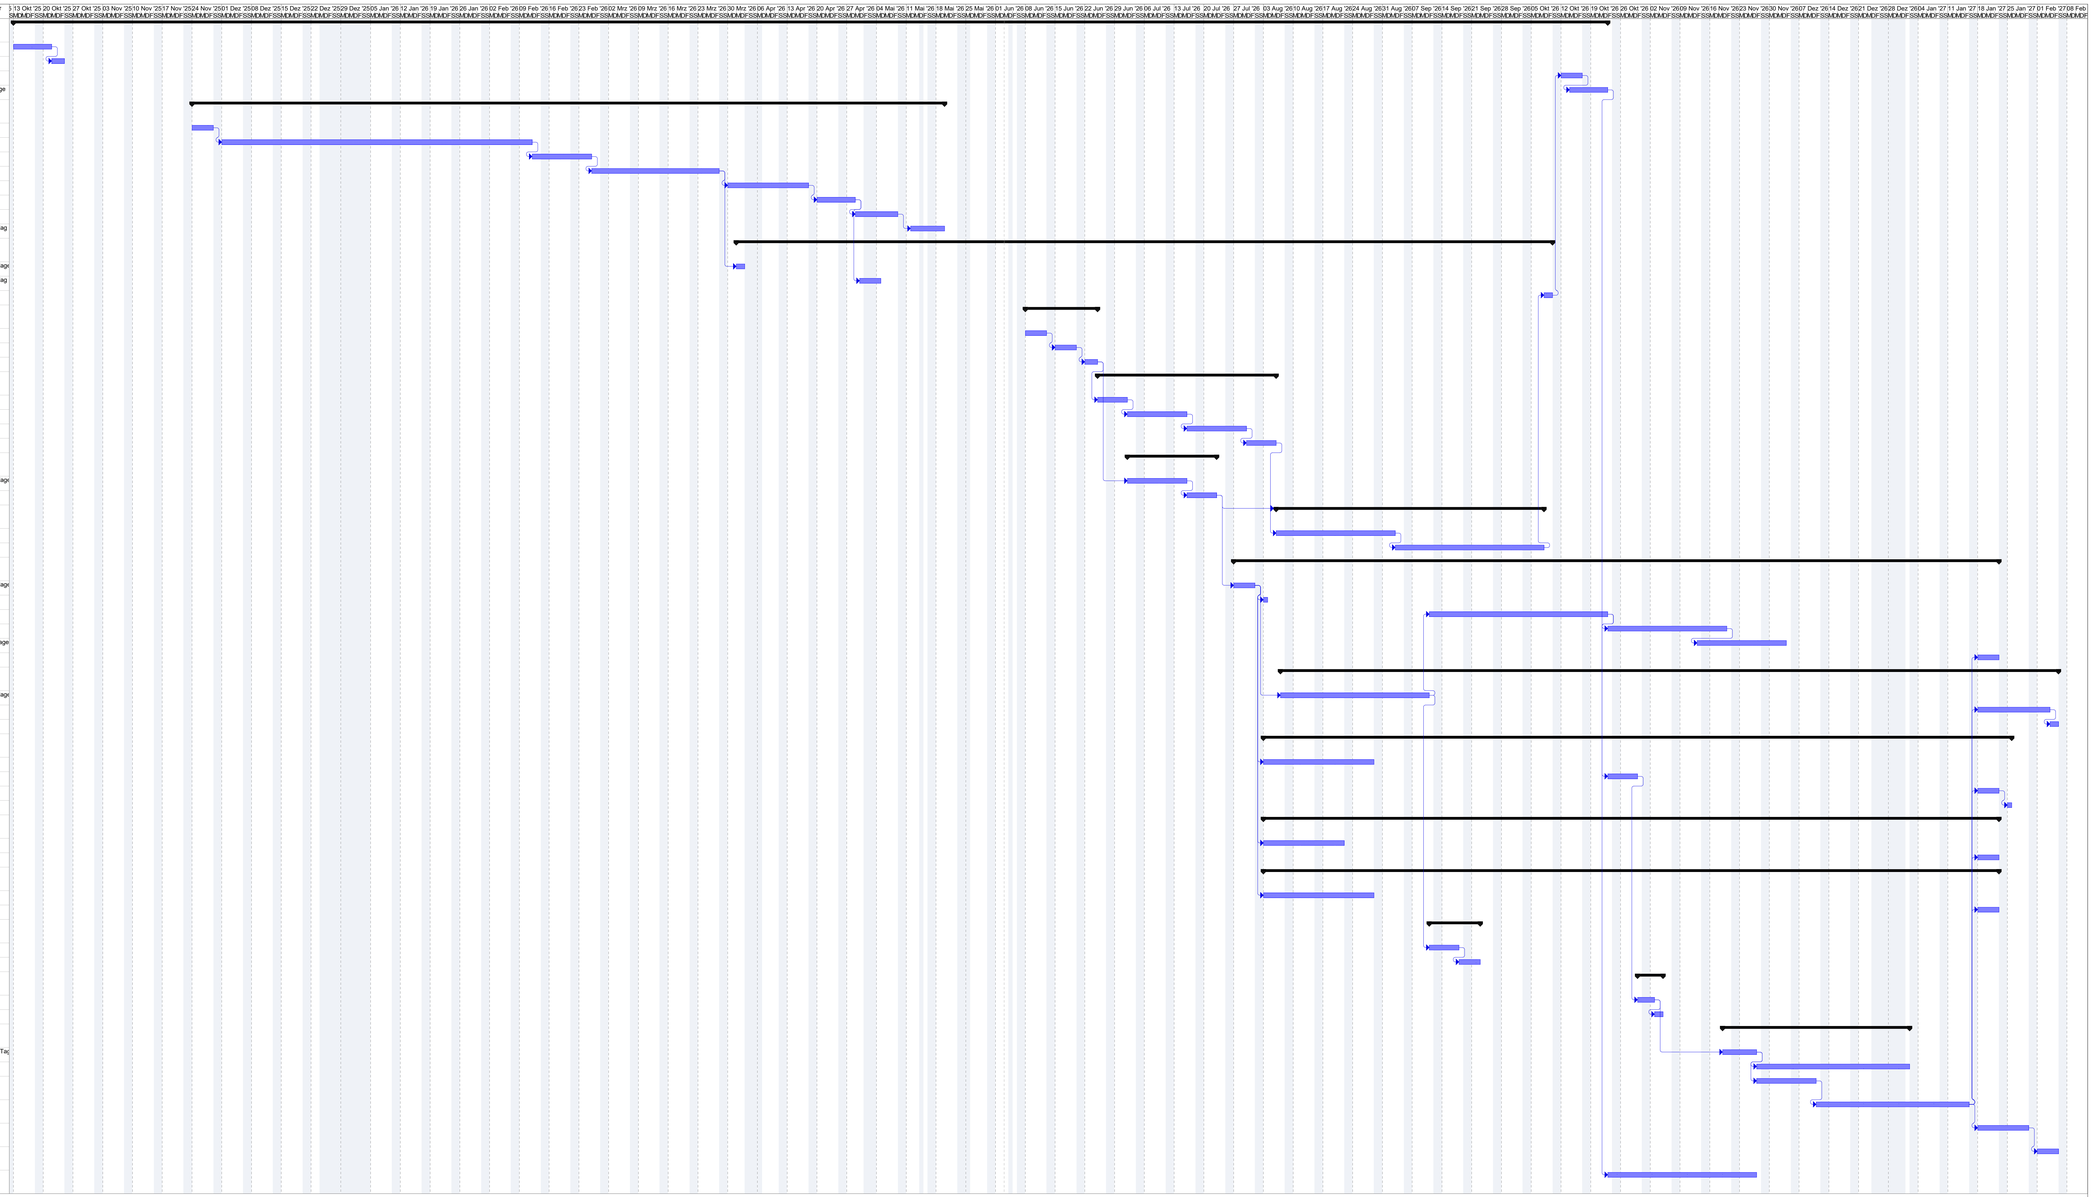

Projekt: Bauzeitenplan 20260603 Datum: Mit 03.06.26	Vorgang		Meilenstein		Projektsammelvorgang		Externer Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Dauer		Manueller Sammelvorgang		Nur Ende		Externer Meilenstein		Stichtag	
	Unterbrechung		Sammelvorgang		Externe Vorgänge		Inaktiver Vorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvollup		Nur Anfang		Externe Vorgänge		In Arbeit			
