825_Kita Ebernhahn

23.04.2026

FISCHER KUHN PARTNER ARCHITEKTEN mbB
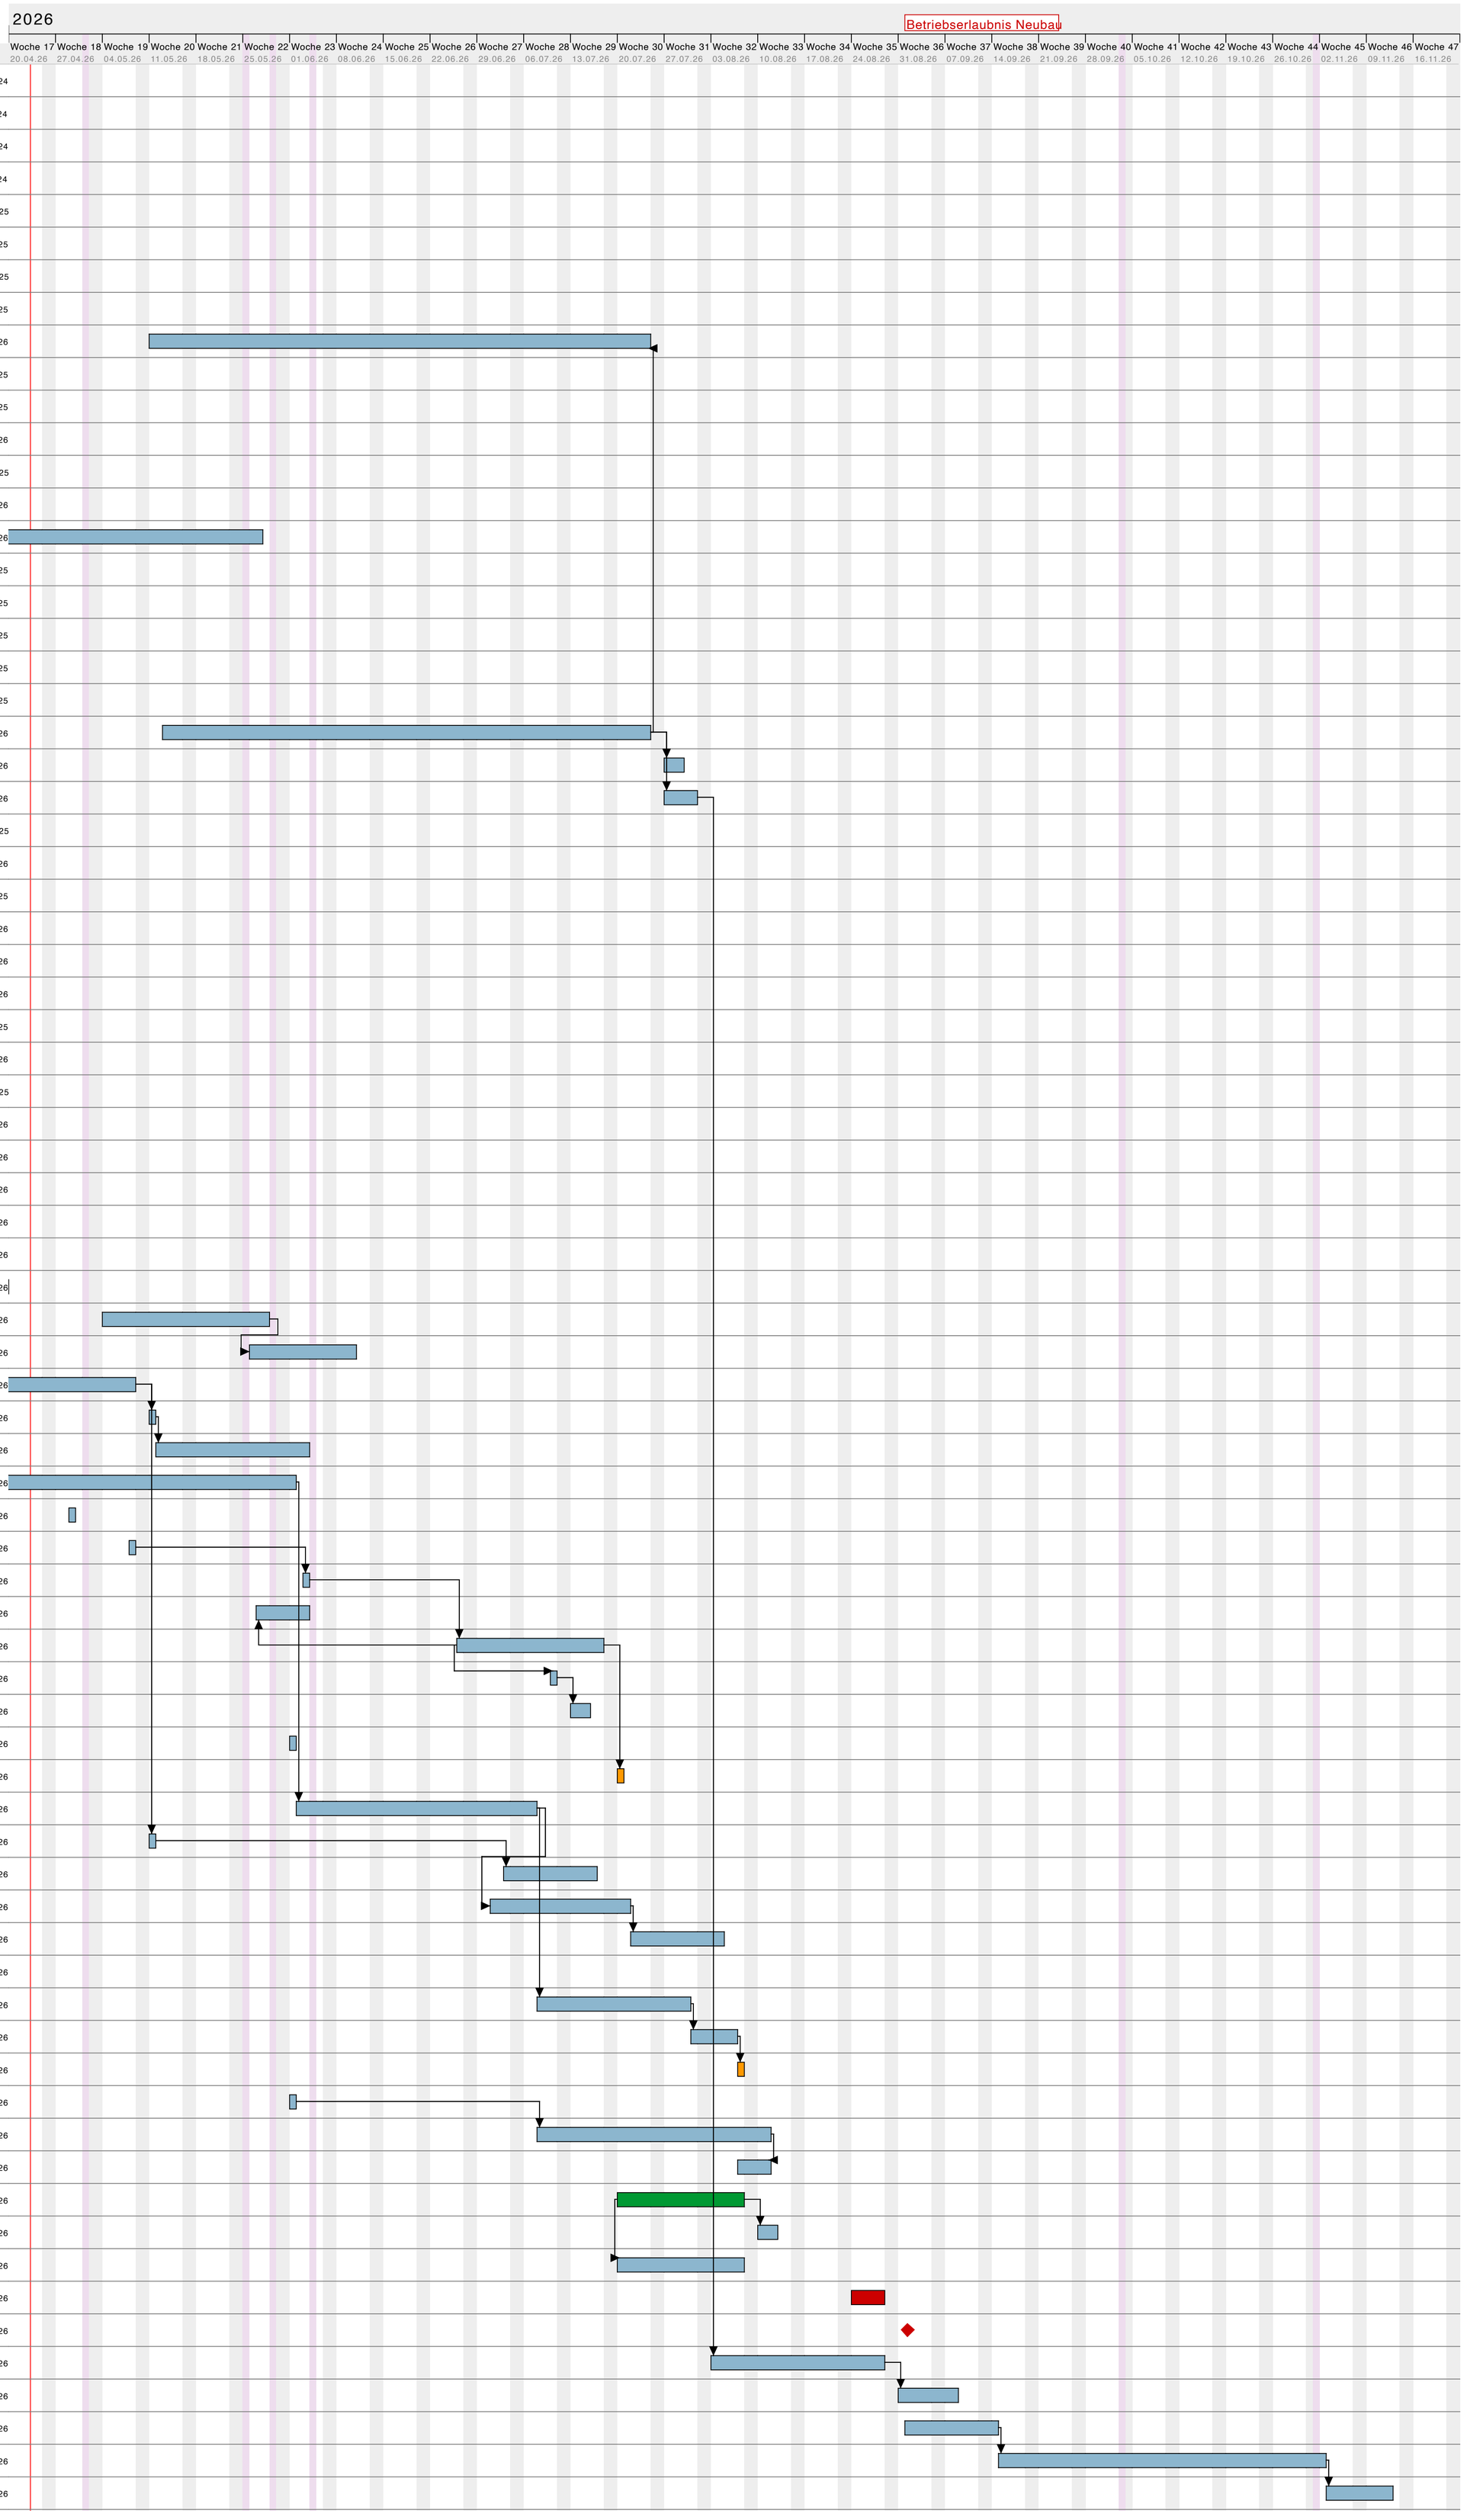
Vorgang	Anfang	Ende
Baustelleneinrichtung	19.06.24	21.06.24
Abbruch	24.06.24	05.07.24
Tiefbau	08.07.24	20.12.24
Kranfundamente	04.12.24	06.12.24
Aufbau Kran	14.01.25	14.01.25
Rohbau	29.01.25	08.08.25
Rückbau Kran	14.08.25	14.08.25
Blitzschutz BP	06.02.25	06.02.25
Gerüstarbeiten	11.05.26	24.07.26
Dachabdichtung	21.07.25	29.08.25
Abdichtung Außenwände	01.09.25	07.10.25
Mangelbeseitigung Abdichtung ...	08.10.25	05.02.26
Perimeterdämmung	13.10.25	14.10.25
Restarbeiten Perimeterdämmung	06.02.26	09.02.26
Restarbeiten Tiefbau	10.02.26	27.05.26
UK RLT	24.07.25	24.07.25
Stahlwange und Dachtreppen aufmessen	01.09.25	01.09.25
Stahlwange und Dachtreppen montieren	30.09.25	30.09.25
Lüftungsgerät	25.08.25	27.08.25
Fensterarbeiten	11.08.25	06.10.25
Außenputz	13.05.26	24.07.26
Blitzschutz	27.07.26	29.07.26
Regenfallrohre montieren	27.07.26	31.07.26
Trockenbau - Wände einseitig beplankt	25.08.25	10.10.25
H/S/L/E - Rohinstallation	13.10.25	06.02.26
Heizung	13.10.25	05.12.25
Sanitär	13.10.25	06.02.26
Lüftung	13.10.25	06.02.26
Elektro	13.10.25	06.02.26
Aufzug	01.09.25	05.09.25
Trockenbau Wände schließen	09.02.26	18.02.26
falsche Schlitze schließen	27.10.25	14.11.25
Innenputzarbeiten	09.02.26	20.02.26
Dämmung unter Estrich	23.02.26	24.02.26
Fußbodenheizung	25.02.26	27.02.26
Estrich	02.03.26	06.03.26
Trockenbauwände spachteln/schleifen	23.03.26	07.04.26
Abhangdecke UK	08.04.26	14.04.26
Abhangdecke Platten	04.05.26	28.05.26
Akustikplatten Wände	26.05.26	10.06.26
Fliesenarbeiten (Beginn mit Küche)	09.04.26	08.05.26
Reinigung Küchenbereich	11.05.26	11.05.26
Küche + Kinderküche	12.05.26	03.06.26
Malerarbeiten	16.04.26	01.06.26
Zusendung Zeichnungen + Stati...	29.04.26	29.04.26
Zusendung Zeichnungen +Statik...	08.05.26	08.05.26
Freigabe Prüfstatik	03.06.26	03.06.26
Fundamente Laubengang	27.05.26	03.06.26
Metallbauarbeiten	26.06.26	17.07.26
Estrich Laubengang	10.07.26	10.07.26
Belag Laubengang	13.07.26	15.07.26
Jalousieklappe Aufzug	01.06.26	01.06.26
Abnahme Aufzug	20.07.26	20.07.26
Bodenbelagsarbeiten (Beginn mit Mensaraum)	02.06.26	07.07.26
WC-Trennwände aufmessen	11.05.26	11.05.26
WC-Trennwände Einbau	03.07.26	16.07.26
H/S/L/E-Fertiginstallation	01.07.26	21.07.26
Restarbeiten Maler	22.07.26	04.08.26
Aufmaß Innentüren	09.03.26	09.03.26
Innentüren	08.07.26	30.07.26
Bauendreinigung	31.07.26	06.08.26
Abnahme Gesundheitsamt + Bauamt	07.08.26	07.08.26
Aufmaß Möblierung	01.06.26	01.06.26
Festmöblierung + konstr. Einbauten	08.07.26	11.08.26
lose Möblierung (bauseits)	07.08.26	11.08.26
Ferien Kita	20.07.26	07.08.26
Abriss Gebäudeteil Turnhalle	10.08.26	12.08.26
Rückbau Hochebene + Anpassung + Montage	20.07.26	07.08.26
Umzug	24.08.26	28.08.26
Betriebserlaubnis Neubau	01.09.26	01.09.26
Außenanlage BA1	03.08.26	28.08.26
Zaunanlagen BA1	31.08.26	08.09.26
Abbruch Bestandsgebäude	01.09.26	14.09.26
Außenanlage BA2	15.09.26	02.11.26
Zaunanlage BA2	03.11.26	12.11.26
