VG Wirges, Umbau+Erweiterung Grundschule, Wirges

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer
1	**LP 4 Genehmigungsplanung**	91at	Mo, 09.02.26	Di, 23.06.26	
1.1	Bauantragsplanung	30at	Mo, 09.02.26	Fr, 20.03.26	Architekten Ritz und Losacker
1.2	Tragwerksplanung	15at	Mo, 02.03.26	Fr, 20.03.26	AK Statiker
1.3	Prüfstatik	20at	Mo, 23.03.26	Di, 21.04.26	
1.4	Erstellung Wärmeschutz	5at	Di, 24.02.26	Mo, 02.03.26	Berthold Damm
1.5	Erstellung Brandschutzkonzept	10at	Mo, 09.03.26	Fr, 20.03.26	
1.6	Planung HLSE	20at	Mo, 23.02.26	Fr, 20.03.26	PB TGA (Hr. Fabian Frye)
1.7	Genehmigungsphase	60at	Mo, 23.03.26	Mo, 22.06.26	Behörde KV des WWK
1.8	BAURECHT	1at	Di, 23.06.26	Di, 23.06.26	Behörde KV des WWK
2	**LP 5 Ausführungsplanung**	74at	Mi, 22.04.26	Fr, 07.08.26	
2.1	Ausführungsplanung Hochbau	54at	Mi, 22.04.26	Fr, 10.07.26	Architekten Ritz und Losacker
2.2	Ausführungsplanung HLSE	15at	Mo, 04.05.26	Di, 26.05.26	PB TGA (Hr. Fabian Frye)
2.3	Schlitz und Durchbruchspläne	5at	Di, 26.05.26	Mo, 01.06.26	PB TGA (Hr. Fabian Frye)
2.4	Werkplanung Dächer	10at	Mo, 29.06.26	Fr, 10.07.26	Architekten Ritz und Losacker
2.5	Werkplanung Schlosser für Überdachung	15at	Mo, 22.06.26	Fr, 10.07.26	Architekten Ritz und Losacker
2.6	Fenster- und Türpläne	5at	Mo, 20.07.26	Fr, 24.07.26	Architekten Ritz und Losacker
2.7	Schal- und Bewehrungspläne	20at	Mo, 15.06.26	Fr, 10.07.26	AK Statiker
2.8	Prüfung durch Prüfstatiker	20at	Mo, 13.07.26	Fr, 07.08.26	
3	**LP 6/7 Ausschreibung + Vergabe**	**121at**	Mo, 20.07.26	Mi, 06.01.27	
3.1	LV Erstellung Rohbau/ Erdarbeiten	5at	Mo, 20.07.26	Fr, 24.07.26	Architekten Ritz und Losacker
3.2	Vergabe Rohbau/ Erdarbeiten	3at	Mo, 28.09.26	Mi, 30.09.26	VG Wirges
3.3	LV HSLE + PV (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro)	15at	Mo, 03.08.26	Fr, 21.08.26	PB TGA (Hr. Fabian Frye)
3.4	Vergabe HSLE + PV	3at	Mo, 28.09.26	Mi, 30.09.26	VG Wirges
3.5	LV Erstellung Zimmerer, Dach, Gerüst, Fenster + Türen	10at	Mo, 24.08.26	Fr, 04.09.26	Architekten Ritz und Losacker
3.6	Vergabe Zimmerer, Dach, Gerüst, Fenster + Türen	3at	Mo, 05.10.26	Mi, 07.10.26	VG Wirges
3.7	LV Erstellung Ausbaugewerke	10at	Mi, 07.10.26	Di, 20.10.26	Architekten Ritz und Losacker
3.8	Vergabe Ausbaugewerke	3at	Mi, 25.11.26	Fr, 27.11.26	VG Wirges
3.9	LV Maler, Bodenbelag, Baureinigung	10at	Mo, 26.10.26	Fr, 06.11.26	Architekten Ritz und Losacker
3.10	Vergabe Maler, Bodenbelag, Baureinigung	3at	Mo, 14.12.26	Mi, 16.12.26	VG Wirges
3.11	LV Außenanlage + Möblierung	10at	Do, 12.11.26	Mi, 25.11.26	Architekten Ritz und Losacker
3.12	Vergabe Außenanlage + Möblierung	3at	Mo, 04.01.27	Mi, 06.01.27	VG Wirges
4	**LP 8 Rohbauphase**	140at	Mo, 05.10.26	Do, 22.04.27	
4.1	Baumfällarbeiten, Gelände freimachen	5at	Mo, 05.10.26	Fr, 09.10.26	
4.2	Erdarbeiten, Tiefbau	30at	Di, 06.10.26	Mo, 16.11.26	
4.3	Schulhofquerung für Versorgungsleitungen Heizung	10at	Mo, 05.10.26	Fr, 16.10.26	
4.4	Regenwasserrückhaltung Tiefbau	5at	Mo, 12.10.26	Fr, 16.10.26	
4.5	Bodenplatte	10at	Di, 17.11.26	Mo, 30.11.26	
4.6	Erstellung Rohbau	53at	Di, 01.12.26	Mo, 15.02.27	
4.7	Zimmerarbeiten	5at	Di, 16.02.27	Mo, 22.02.27	
4.8	Gerüststellung	2at	Mo, 25.01.27	Di, 26.01.27	
4.9	Dachdeckungsarbeiten	15at	Di, 23.02.27	Mo, 15.03.27	
4.10	Schlosserarbeiten Schulhofkonstruktion	10at	Mo, 18.01.27	Fr, 29.01.27	
4.11	Aufmaß Fenster und Türen + Fertigung	40at	Mo, 15.02.27	Di, 13.04.27	
4.12	Fenstereinbau	5at	Mi, 14.04.27	Di, 20.04.27	
4.13	Einbau Außentüren	2at	Mi, 21.04.27	Do, 22.04.27	
5	**LP 8 Ausbau**	163at	Mi, 21.04.27	Do, 09.12.27	
5.1	Elektroinstallation	30at	Mi, 21.04.27	Fr, 04.06.27	
5.2	Heizungs- und Sanitärinstallation	15at	Mo, 26.04.27	Di, 18.05.27	
5.3	Rohinstallation Lüftung	5at	Mo, 10.05.27	Fr, 14.05.27	
5.4	PV Anlage auf Dach montieren	10at	Mi, 12.05.27	Mi, 26.05.27	
5.5	Innenputzarbeiten + Trocknung	20at	Mo, 07.06.27	Fr, 02.07.27	
5.6	Trockenbauarbeiten Wände, Vorwände	10at	Mo, 05.07.27	Fr, 16.07.27	
5.7	Bodendämmung und FB- Heizungsverlegung	5at	Mo, 19.07.27	Fr, 23.07.27	
5.8	Estricharbeiten	5at	Mo, 26.07.27	Fr, 30.07.27	
5.9	Trockenbau Decken	20at	Mo, 02.08.27	Fr, 27.08.27	
5.10	Innentüren: Türzargen	3at	Mi, 25.08.27	Fr, 27.08.27	
5.11	Fliesenarbeiten	20at	Mo, 30.08.27	Fr, 24.09.27	
5.12	Malerarbeiten Wände/ Decken	30at	Mo, 23.08.27	Fr, 01.10.27	
5.13	Fertiginstallation Elektro	15at	Mo, 04.10.27	Fr, 22.10.27	
5.14	Fertiginstallation Sanitär	10at	Mo, 04.10.27	Fr, 15.10.27	
5.15	Fertiginstallation Lüftung	5at	Mo, 11.10.27	Fr, 15.10.27	
5.16	Fertiginstallation Heizung	5at	Mo, 11.10.27	Fr, 15.10.27	
5.17	Bodenbelagsarbeiten	29at	Mo, 04.10.27	Fr, 12.11.27	
5.18	Innentüren: Türblätter	2at	Mo, 25.10.27	Di, 26.10.27	
5.19	Montage bewegliche Trennwand	1at	Mo, 08.11.27	Mo, 08.11.27	
5.20	WC Trennwände	1at	Di, 09.11.27	Di, 09.11.27	
5.21	Baureinigungsarbeiten	2at	Mo, 15.11.27	Di, 16.11.27	
5.22	Außenanlage	40at	Mo, 09.08.27	Fr, 01.10.27	
5.23	Bepflanzung	5at	Mo, 04.10.27	Fr, 08.10.27	
5.24	Möblierung/ Einrichtung	1at	Di, 07.12.27	Di, 07.12.27	
5.25	Fertigstellung und Umzug	1at	Do, 09.12.27	Do, 09.12.27	

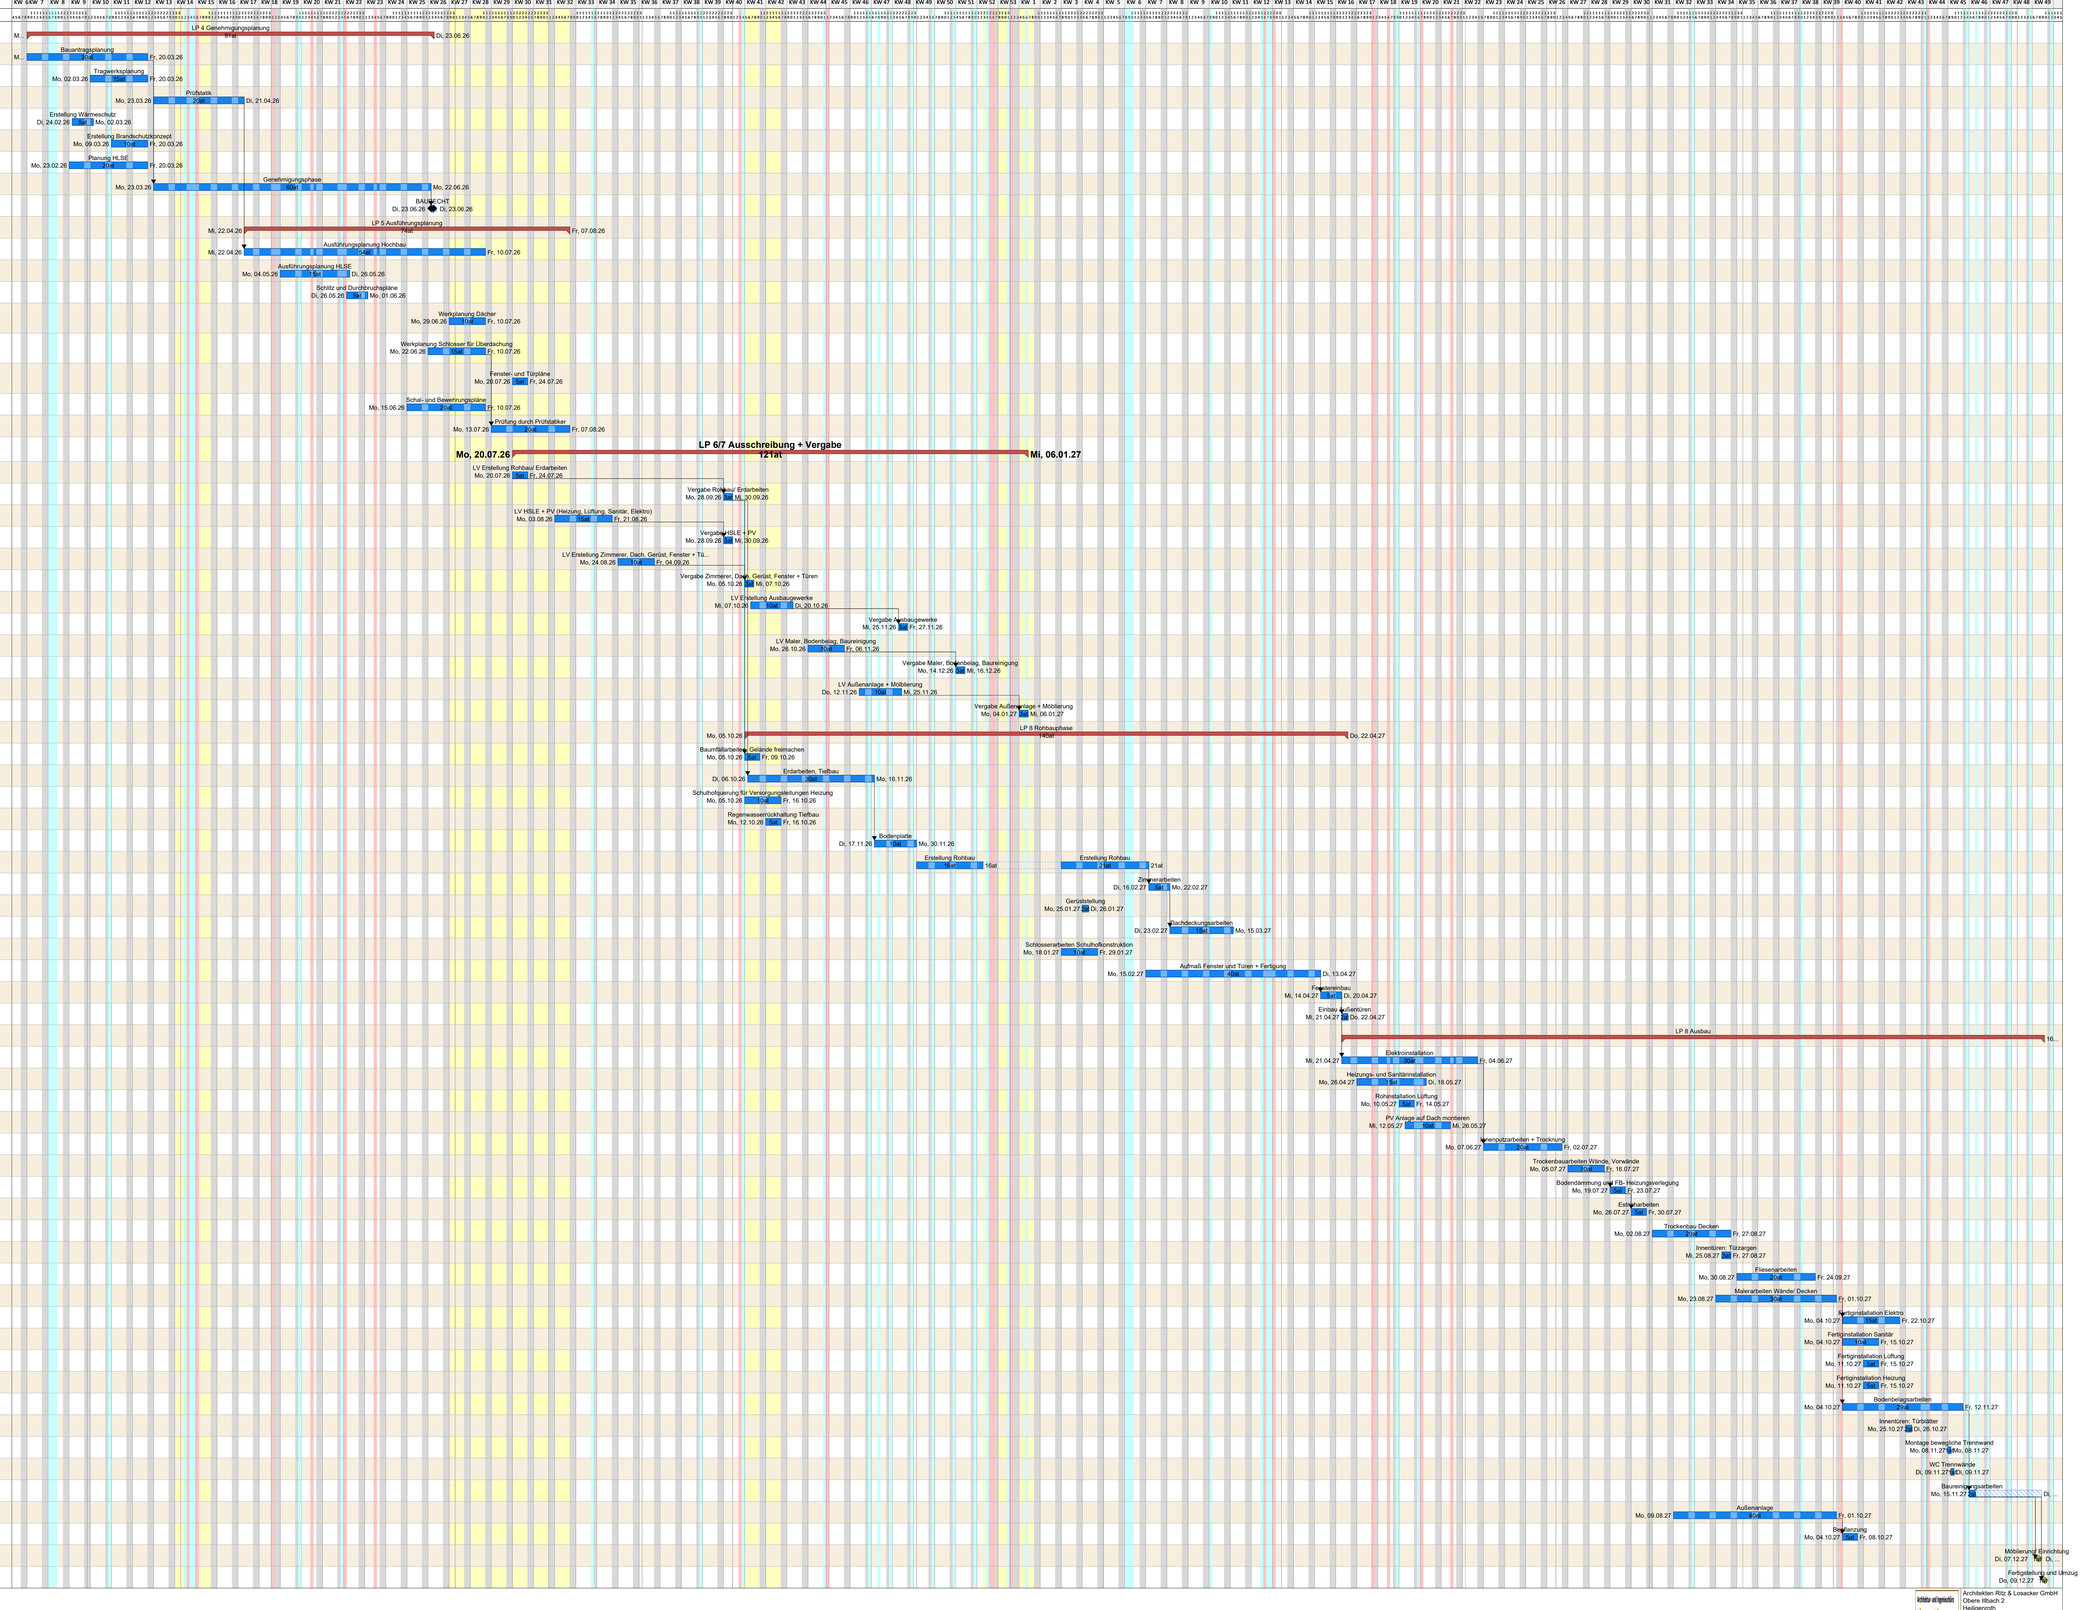

Projektzeitrahmen von So, 01.02.26 bis Mo, 31.01.28
Kalender: Rheinland-Pfalz (eingeschränkt)
Druckdatum: 30.06.2026 16:58
Filter:
Bearbeiter: schermuly

Architekten Ritz & Losacker GmbH
Obere Illbach 2
Heiligenroth
Tel. +49 2602 997820
Fax +49 2602 9978259
e-Mail: info@ritz-losacker.de
