
Nr.		Vorgangsmodus	Vorgangsname	Zuständig	Anfang	Ende
1						
2						
3			**Vorlauf Planung**		**Fre 13.02.26**	**Don 25.06.26**
15			*Sommerferien*		Mon 29.06.26	Fre 07.08.26
16			Rückbaubeginn TGA	TGA	Mon 21.09.26	Mon 21.09.26
17			TGA: Elektrotechnik	ELT	Mon 21.09.26	Mon 12.10.26
18			TGA: Raumlufttechnik	RLT	Mon 21.09.26	Mon 12.10.26
19			Baubeginn Objektplanung	MPA	Mon 05.10.26	Mon 05.10.26
20			Trockenbau Wände UK + einseitig beplankt	TRO	Mon 05.10.26	Don 05.11.26
21			Vorinstallation Wände + Decken ELT	ELT	Mon 02.11.26	Fre 11.12.26
22			Vorinstallation Decke RLT	RLT	Mon 09.11.26	Fre 11.12.26
23			Trockenbau Wände schließen	TRO	Mon 07.12.26	Die 05.01.27
24			Boden schleifen	BBL	Mon 11.01.27	Fre 22.01.27
25			Boden spachteln + einbauen	BBL	Mon 25.01.27	Fre 26.02.27
26			BSK Wände	BSK	Mon 25.01.27	Fre 29.01.27
27			UK Odenwald-Decke	TRO	Mon 08.02.27	Fre 19.03.27
28			Abmauern Türen	EMB	Mon 15.03.27	Fre 19.03.27
29			Beiputzarbeiten	IPU	Mon 22.03.27	Mit 31.03.27
30			Malerarbeiten: Vlies + Anstrich	MAL	Mon 22.03.27	Fre 23.04.27
31			Einbau OWA-Platten	TRO	Mon 29.03.27	Fre 16.04.27
32			Einbau Türen		Mon 05.04.27	Fre 16.04.27
33			Endinstallation ELT	ELT	Mon 05.04.27	Fre 14.05.27
34			Endinstallation RLT	RLT	Mon 05.04.27	Fre 14.05.27
35			Abnahmen + Mängelbeseitigung		Mon 10.05.27	Fre 28.05.27

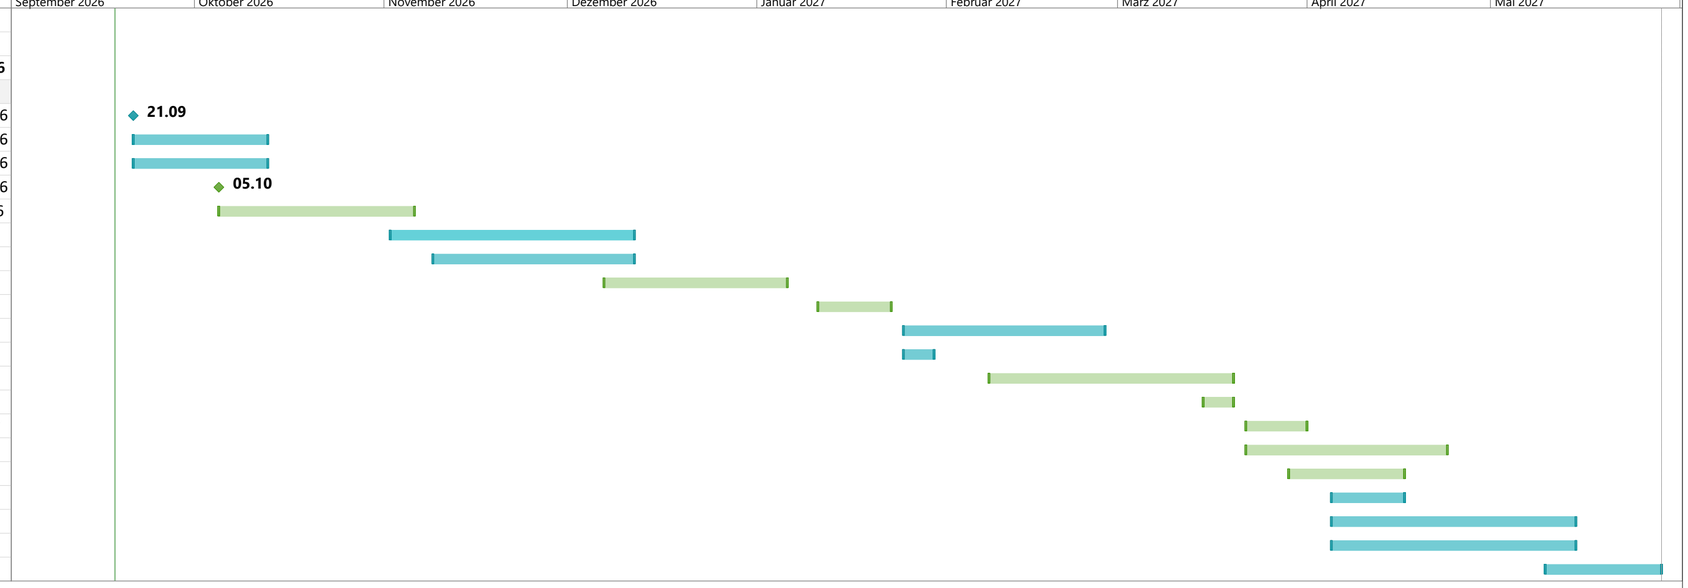

Projekt: Messe-Pirmasens_Rahm
Datum: Fre 18.09.26

Vorgang
Sammelvorgang
Inaktiver Meilenstein
Nur Dauer
Nur Anfang
Externer Meilenstein
Manueller Fortschritt
Unterbrechung
Projektsammelvorgang
Inaktiver Sammelvorgang
Manueller Sammelrollup
Nur Ende
Stichtag
Meilenstein
Inaktiver Vorgang
Manueller Vorgang
Manueller Sammelvorgang
Externe Vorgänge
In Arbeit
