Verbandsgemeindewerke Birkenfeld

Erneuerung der Wasserleitung in der Hauptstraße L 175 in der OG Schwollen

Zeitschiene
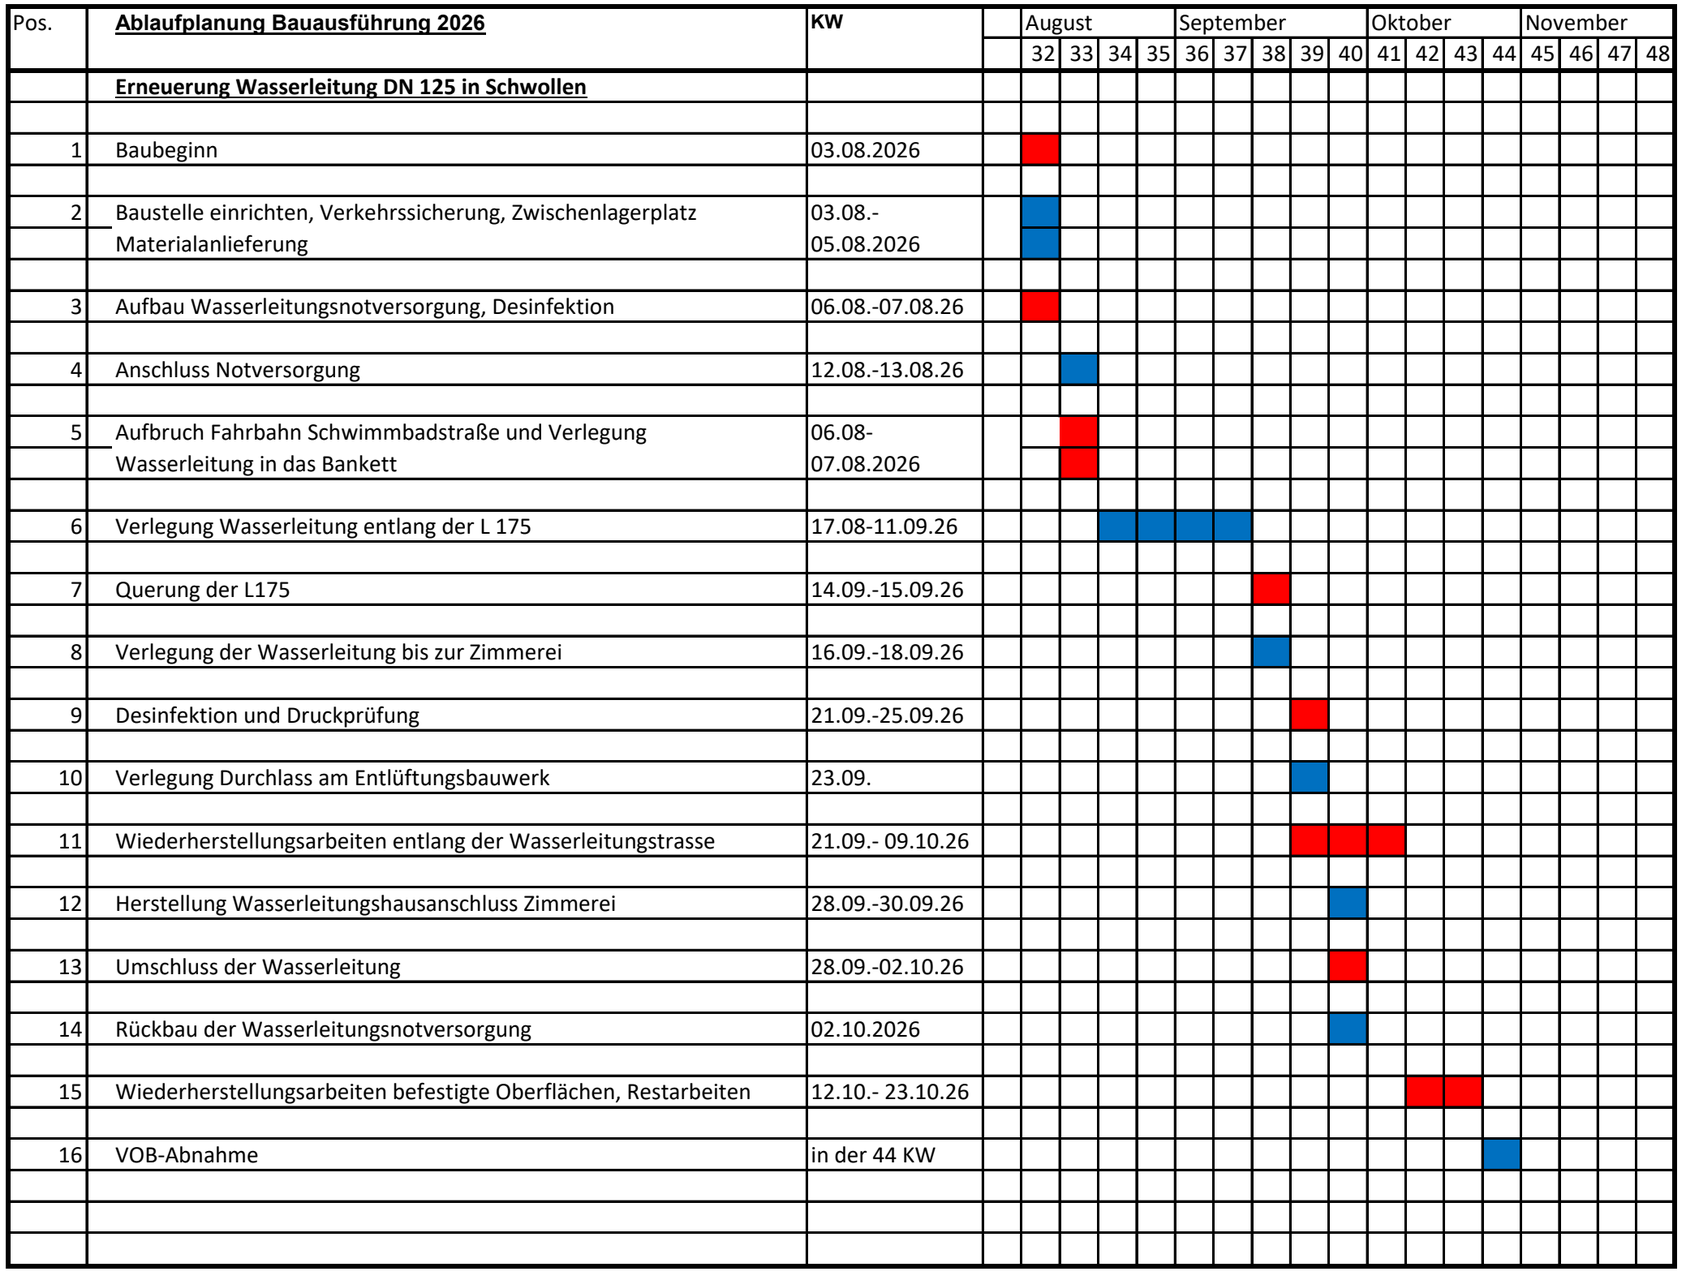
Pos.	Ablaufplanung Bauausführung 2026	KW
	Erneuerung Wasserleitung DN 125 in Schwollen	
1	Baubeginn	03.08.2026
2	Baustelle einrichten, Verkehrssicherung, Zwischenlagerplatz Materialanlieferung	03.08.-05.08.2026
3	Aufbau Wasserleitungsnotversorgung, Desinfektion	06.08.-07.08.26
4	Anschluss Notversorgung	12.08.-13.08.26
5	Aufbruch Fahrbahn Schwimmbadstraße und Verlegung Wasserleitung in das Bankett	06.08-07.08.2026
6	Verlegung Wasserleitung entlang der L 175	17.08-11.09.26
7	Querung der L175	14.09.-15.09.26
8	Verlegung der Wasserleitung bis zur Zimmerei	16.09.-18.09.26
9	Desinfektion und Druckprüfung	21.09.-25.09.26
10	Verlegung Durchlass am Entlüftungsbauwerk	23.09.
11	Wiederherstellungsarbeiten entlang der Wasserleitungstrasse	21.09.- 09.10.26
12	Herstellung Wasserleitungshausanschluss Zimmerei	28.09.-30.09.26
13	Umschluss der Wasserleitung	28.09.-02.10.26
14	Rückbau der Wasserleitungsnotversorgung	02.10.2026
15	Wiederherstellungsarbeiten befestigte Oberflächen, Restarbeiten	12.10.- 23.10.26
16	VOB-Abnahme	in der 44 KW
