Erweiterung Katholischer Kindergarten St. Sebastian
Kreuzstraße 13, 76835 Roschbach

Bauzeitenplan Stand 09.04.2026 - INDEX 3 - zeitliche Anpassung / Rücksprache Rohbauer

RHEINWALT ARCHITEKTEN

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1				
2	Weihnachtsferien 2025 RLP	13 Tage	Mon 22.12.25	Mit 07.01.26
3	Osterferien 2026 RLP	10 Tage	Mon 30.03.26	Fre 10.04.26
4	Sommerferien 2026 RLP	30 Tage	Mon 29.06.26	Fre 07.08.26
5	Herbstferien 2026 RLP	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26
6	Weihnachtsferien 2026 RLP	13 Tage	Mit 23.12.26	Fre 22.01.27
7				
8	Baubeginn	0 Tage	Don 16.04.26	Don 16.04.26
9	Herrichten Baugelände	10 Tage	Don 16.04.26	Mit 29.04.26
10	Rückbau Fassade Bestandsgebäude	10 Tage	Don 30.04.26	Mit 13.05.26
11	Abbundplan Zimmermann	1 Tag	Don 30.04.26	Don 30.04.26
12	Produktion Fenster (nach Abbundplan)	1 Tag	Don 30.04.26	Don 30.04.26
13	Rohbauarbeiten Baugrube	8 Tage	Don 14.05.26	Mon 25.05.26
14	Einbau Fundament- / Ringerder	2 Tage	Die 26.05.26	Mit 27.05.26
15	Rohbauarbeiten Bodenplatte / Aufkantung	25 Tage	Don 28.05.26	Mit 01.07.26
16	Gerüst stellen	3 Tage	Don 02.07.26	Mon 06.07.26
17	Holzbauarbeiten Wände EG	5 Tage	Don 02.07.26	Mit 08.07.26
18	Holzbauarbeiten Decke	5 Tage	Don 09.07.26	Mit 15.07.26
19	Holzbauarbeiten Wände OG	5 Tage	Don 16.07.26	Mit 22.07.26
20	Holzbauarbeiten Dach	10 Tage	Don 23.07.26	Mit 05.08.26
21	Einbau Fenster Anbau	8 Tage	Don 06.08.26	Mon 17.08.26
22	Holzbauarbeiten Fassade	10 Tage	Die 18.08.26	Mon 31.08.26
23	Gipser Außenputz inkl. Trocknungszeit	25 Tage	Die 01.09.26	Mon 05.10.26
24	Gerüst abbauen	2 Tage	Die 06.10.26	Mit 07.10.26
25	Außenanlage / Hoffläche	20 Tage	Don 08.10.26	Mit 04.11.26
26	Sommerferien KITA	16 Tage	Fre 17.07.26	Fre 07.08.26
27	Abbruch / Umbau Innen Bestandsgebäude	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26
28	Trockenbauarbeiten 1. Seite Bestand	3 Tage	Don 23.07.26	Mon 27.07.26
29	Heizungsarbeiten Grundinstallation im Bestand	8 Tage	Die 28.07.26	Don 06.08.26
30	Sanitärarbeiten Grundinstallation im Bestand	8 Tage	Die 28.07.26	Don 06.08.26
31	Elektroarbeiten Grundinstallation im Bestand	8 Tage	Die 28.07.26	Don 06.08.26
32	Trockenbauarbeiten 2. Seite Bestand	3 Tage	Fre 07.08.26	Die 11.08.26
33	Fliesenarbeiten	5 Tage	Mit 12.08.26	Die 18.08.26
34	Gipser Grundputz Bestand	2 Tage	Mit 12.08.26	Don 13.08.26
35	Trockenbauarbeiten Decken	3 Tage	Mit 12.08.26	Fre 14.08.26
36	Gipser Oberputz Bestand	3 Tage	Fre 21.08.26	Die 25.08.26
37	Bodenbelagsarbeiten Bestand	5 Tage	Mit 26.08.26	Die 01.09.26
38	Innentüren Bestand	5 Tage	Mit 02.09.26	Die 08.09.26
39	Trockenbauarbeiten 1. Seite Anbau	15 Tage	Die 01.09.26	Mon 21.09.26
40	Heizungsarbeiten Grundinstallation Anbau	30 Tage	Die 22.09.26	Mon 02.11.26
41	Sanitärarbeiten Grundinstallation Anbau	30 Tage	Die 22.09.26	Mon 02.11.26
42	Elektroarbeiten Grundinstallation Anbau	30 Tage	Die 22.09.26	Mon 02.11.26
43	Lüftungsarbeiten Grundinstallation Anbau	30 Tage	Die 22.09.26	Mon 02.11.26
44	Trockenbauarbeiten 2. Seite Anbau	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26
45	Trockenbauarbeiten Decken / Dachschräge	15 Tage	Don 12.11.26	Mit 02.12.26
46	Estricharbeiten Anbau	10 Tage	Don 03.12.26	Mit 16.12.26
47	Estrichtrocknung (21 Tage)	15 Tage	Don 17.12.26	Mon 25.01.27
48	Trockenbauarbeiten Fertigspachtelung	5 Tage	Die 26.01.27	Mon 01.02.27
49	Malerarbeiten Innen	10 Tage	Fre 29.01.27	Don 11.02.27
50	Fliesenarbeiten	15 Tage	Fre 05.02.27	Don 25.02.27
51	Bodenbelagsarbeiten	15 Tage	Fre 12.02.27	Don 04.03.27
52	Heizungsarbeiten Endinstallation	15 Tage	Fre 26.02.27	Don 18.03.27
53	Sanitärarbeiten Endinstallation	15 Tage	Fre 26.02.27	Don 18.03.27
54	Elektroarbeiten Endinstallation	15 Tage	Fre 26.02.27	Don 18.03.27
55	Lüftungsarbeiten Endinstallation	15 Tage	Fre 26.02.27	Don 18.03.27
56	Zwischenreinigung	5 Tage	Mit 10.03.27	Die 16.03.27
57	Küche / Festeinbauten	10 Tage	Mit 17.03.27	Die 30.03.27
58	Innentüren	5 Tage	Fre 26.03.27	Don 01.04.27
59	Endreinigung	5 Tage	Mit 31.03.27	Die 06.04.27
60	Einrichtung	10 Tage	Mit 07.04.27	Die 20.04.27
61				
62	Abnahmen	7 Tage	Mit 21.04.27	Don 29.04.27
63	Fertigstellung	1 Tag	Fre 30.04.27	Fre 30.04.27

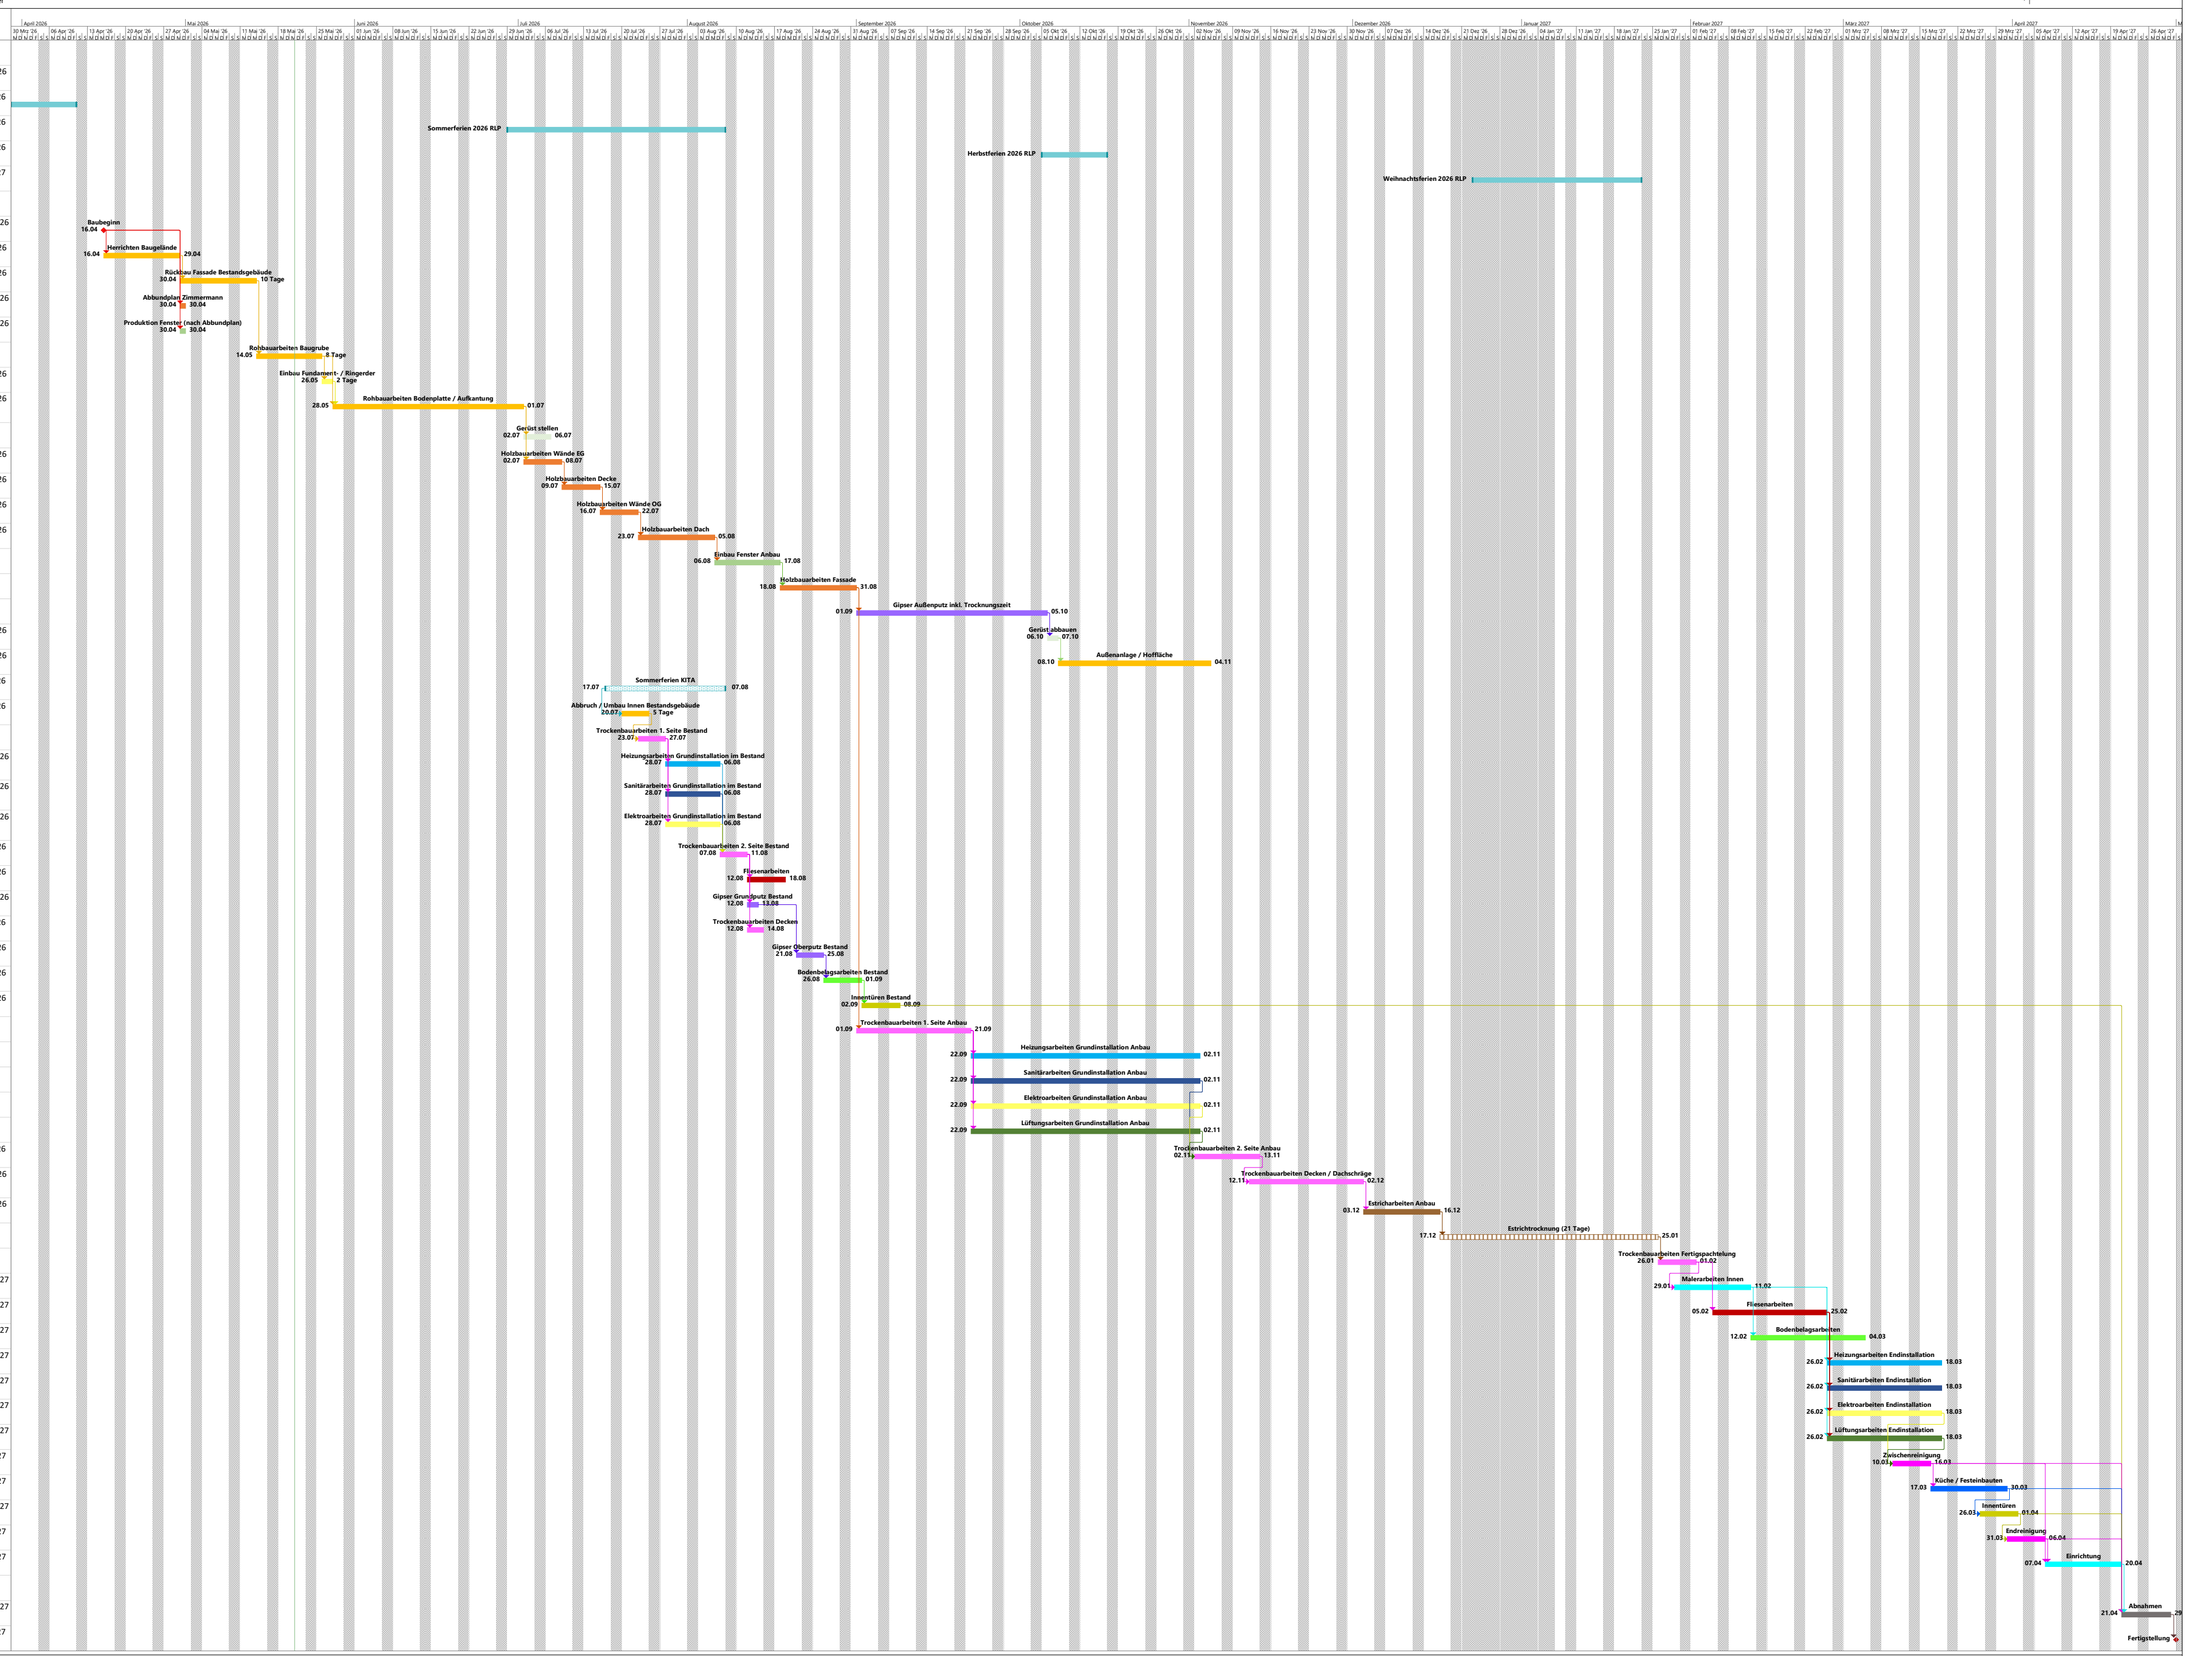

Projekt: 251114_Bauzeitenplan KiTa Roschbach
Datum: Don 21.05.26

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt
