Projektnummer:

Bauzeitenplan

Bauzeitenplan_neu

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Bauphase	74at	Di, 01.09.26	Fr, 11.12.26
1.1	Beginn Bauzeit	1at	Di, 01.09.26	Di, 01.09.26
1.2	Wasserhaltung	64at	Mi, 02.09.26	Mo, 30.11.26
1.3	Demontage	4at	Di, 08.09.26	Fr, 11.09.26
1.4	Bautechnische Sanierung	5at	Mo, 14.09.26	Fr, 18.09.26
1.5	Technische Ausrüstung	11at	Mo, 12.10.26	Mo, 26.10.26
1.6	Edelstahlvorlagebehälter	16at	Mo, 21.09.26	Mo, 12.10.26
1.7	Pumpen / Aggregate	25at	Di, 27.10.26	Mo, 30.11.26
1.8	Rechenanlage Umbau, Betonsanierung	9at	Di, 01.12.26	Fr, 11.12.26
1.9	Ende Bauzeit	1at	Fr, 11.12.26	Fr, 11.12.26

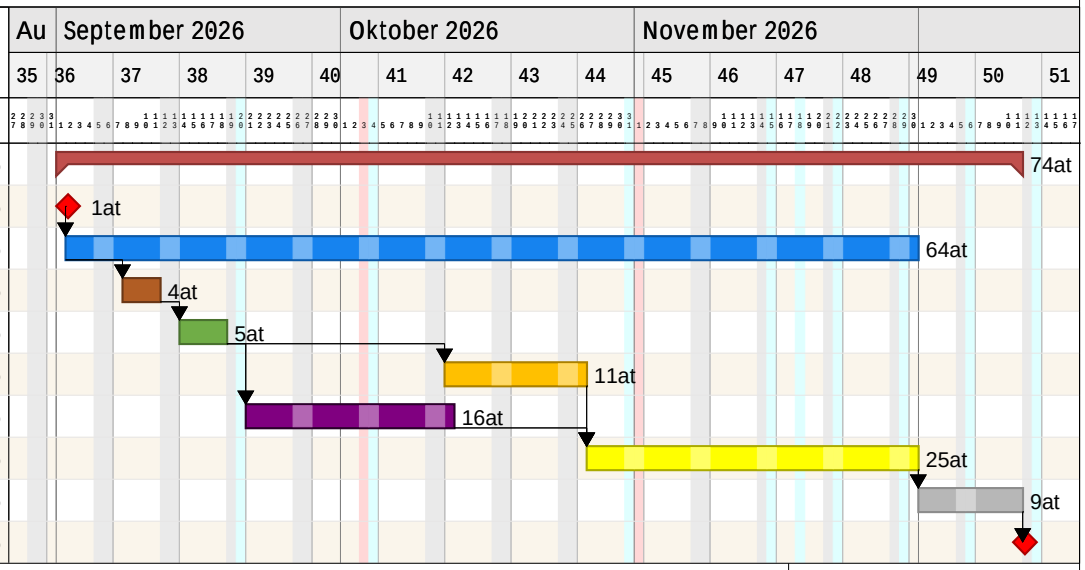

Projektzeitrahmen von Mo, 26.01.26 bis Do, 31.12.26
Kalender: Rheinland-Pfalz (eingebettet)
Druckdatum: 09.04.2026 14:37
Filter:

erstellt mit pro-Plan 7 (7.0.0.25) Serien Nr.: 940 Lizenz für TeamBau, Bad Bergzabern
